



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.904.870,23			1.796.364,82						1.796.364,82			108.505,41	
1.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	182,5	2,50	456,25	182,50	100,00%	456,25				-	182,50	100,00%	456,25	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENT	UN	0,50	387.314,07	193.657,04	0,47	94,30%	182.623,28				-	0,47	94,30%	182.623,28	0,03	5,70%	11.033,75
1.3	CANTEIRO DE OBRA	UN	0,50	587.453,23	293.726,62	0,47	94,30%	276.991,32				-	0,47	94,30%	276.991,32	0,03	5,70%	16.735,29
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	0,50	2.834.060,66	1.417.030,33	0,47	94,30%	1.336.293,97				-	0,47	94,30%	1.336.293,97	0,03	5,70%	80.736,36
2	TERRAPLENAGEM				74.549,33			66.646,15						66.646,15			7.903,19	
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	6.709,17	0,67	4.495,14	6.709,17	100,00%	4.495,14				-	6.709,17	100,00%	4.495,14	0,00	0,00%	-
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,29	978,17							-	0,00	0,00%	-	134,18	100,00%	978,17
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	7,74	1.038,55	134,18	100,00%	1.038,55				-	134,18	100,00%	1.038,55	0,00	0,00%	- 0,00
2.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	8,15	1.093,57	134,18	100,00%	1.093,57				-	134,18	100,00%	1.093,57	0,00	0,00%	-
2.5	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,06	1.215,67	134,18	100,00%	1.215,67				-	134,18	100,00%	1.215,67	0,00	0,00%	- 0,00
2.6	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,36	1.255,92	134,18	100,00%	1.255,92				-	134,18	100,00%	1.255,92	0,00	0,00%	- 0,00
2.7	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	9,68	1.298,86	134,18	100,00%	1.298,86				-	134,18	100,00%	1.298,86	0,00	0,00%	- 0,00
2.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,56	1.416,94	134,18	100,00%	1.416,94				-	134,18	100,00%	1.416,94	0,00	0,00%	- 0,00
2.9	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	10,80	1.449,14	134,18	100,00%	1.449,14				-	134,18	100,00%	1.449,14	0,00	0,00%	- 0,00
2.10	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,12	1.492,08	134,18	100,00%	1.492,08				-	134,18	100,00%	1.492,08	0,00	0,00%	- 0,00
2.11	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	11,42	1.532,34	134,18	100,00%	1.532,34				-	134,18	100,00%	1.532,34	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.12	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	12,50	1.677,25	134,18	100,00%	1.677,25	-	134,18	100,00%	1.677,25	0,00	0,00%	-		
2.13	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	13,86	1.859,73	134,18	100,00%	1.859,73	-	134,18	100,00%	1.859,73	0,00	0,00%			0,00
2.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - comescavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	134,18	14,35	1.925,48	134,18	100,00%	1.925,48	-	134,18	100,00%	1.925,48	0,00	0,00%			-
2.15	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.341,82	5,97	8.010,67	483,00	36,00%	2.883,51	-	483,00	36,00%	2.883,51	858,82	64,00%			5.127,16
2.16	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	4.025,47	10,50	42.267,38	4.001,14	99,40%	42.011,95	-	4.001,14	99,40%	42.011,95	24,33	0,60%			255,43
2.17	Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial	m³	11,10	138,96	1.542,46			-	-	0,00	0,00%	-	11,10	100,00%			1.542,46
3	MANUTENÇÃO E MELHORAMENTOS LOCALIZADOS				2.128.762,30			2.046.361,36				2.046.361,36					82.400,93
3.1	Reconformação da plataforma	m²	3.667,13	0,13	476,73	3.596,00	98,06%	467,48	-	3.596,00	98,06%	467,48	71,13	1,94%			9,25
3.2	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	m³	550,07	13,66	7.513,96	495,00	89,99%	6.761,71	-	495,00	89,99%	6.761,71	55,07	10,01%			752,24
3.3	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	17.287,88	0,19	3.284,70	10.600,00	61,31%	2.014,00	-	10.600,00	61,31%	2.014,00	6.687,88	38,69%			1.270,70
3.4	Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida	m²			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.5	Solo para base de remendo profundo	m³	2.212,85	5,95	13.166,46	2.212,85	100,00%	13.166,46	-	2.212,85	100,00%	13.166,46	0,00	0,00%			-
3.6	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	553,21	78,66	43.515,50	553,21	100,00%	43.515,50	-	553,21	100,00%	43.515,50	0,00	0,00%			-
3.7	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.8	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	691,52	357,51	247.223,53	691,51	100,00%	247.222,54	-	691,51	100,00%	247.222,54	0,00	0,00%			0,99
3.9	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.10	Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.11	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	1.037,28	15,06	15.621,36	1.037,28	100,00%	15.621,40	-	1.037,28	100,00%	15.621,40	0,00	0,00%			0,04
3.12	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	1.466,85	9,47	13.891,07	1.466,83	100,00%	13.890,88	-	1.466,83	100,00%	13.890,88	0,02	0,00%			0,19
3.13	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	1.037,28	464,02	481.316,35	1.037,28	100,00%	481.316,35	-	1.037,28	100,00%	481.316,35	0,00	0,00%			-
3.14	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.15	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.16	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.17	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.18	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	1.047,80	14,51	15.203,57	1.023,90	97,72%	14.856,79	-	1.023,90	97,72%	14.856,79	23,90	2,28%			346,78
3.19	Remoção manual de barreira em solo	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.20	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.21	Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida	m³			-			-	-	0,00		-	0,00				-
3.22	Limpeza de ponte	m	63,50	5,36	340,36			-	-	0,00	0,00%	-	63,50	100,00%			340,36

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
3.23	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	825,00	0,89	734,25	825,00	100,00%	734,25				825,00	100,00%	734,25	0,00	0,00%	-
3.24	Limpeza de valeta de corte	m	412,50	1,34	552,75							0,00	0,00%	-	412,50	100,00%	552,75
3.25	Limpeza de vala de drenagem	m			-							0,00		-	0,00		-
3.26	Limpeza de descida d'água	m	36,00	1,79	64,44	36,00	100,00%	64,44				36,00	100,00%	64,44	0,00	0,00%	-
3.27	Limpeza de bueiro	m³	246,15	26,84	6.606,53	246,15	100,00%	6.606,53				246,15	100,00%	6.606,53	0,00	0,00%	-
3.28	Desobstrução de bueiro	m³	72,40	80,53	5.829,97	67,03	92,59%	5.397,82				67,03	92,59%	5.397,82	5,37	7,41%	432,15
3.29	Caiçação manual com fixador de cal	m²	668,18	4,07	2.719,47							0,00	0,00%	-	668,18	100,00%	2.719,47
3.30	Roçada manual	ha	14,29	2.296,47	32.816,56	1,20	8,40%	2.755,76				1,20	8,40%	2.755,76	13,09	91,60%	30.060,79
3.31	Roçada manual de capim colônio	ha			-							0,00		-	0,00		-
3.32	Roçada mecanizada com roçadeira de arraste	ha	53,98	513,99	27.742,61							0,00	0,00%	-	53,98	100,00%	27.742,61
3.33	Capina manual	m²	247,50	0,92	227,70							0,00	0,00%	-	247,50	100,00%	227,70
3.34	Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura	m³	26,20	259,41	6.795,24							0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	6.795,24
3.35	Corte e remoção de árvores	m³	104,78	19,57	2.050,54							0,00	0,00%	-	104,78	100,00%	2.050,54
3.36	Roçada com roçadeira costal	ha	9,53	955,26	9.098,85							0,00	0,00%	-	9,53	100,00%	9.098,85
3.37	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t			-							0,00		-	0,00		-
3.38	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t			-							0,00		-	0,00		-
3.39	Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes	un			-							0,00		-	0,00		-
3.40	Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre	t			-							0,00		-	0,00		-
3.41	Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	t			-							0,00		-	0,00		-
3.42	Remoção de emborrachados de pneus em rodovia	t			-							0,00		-	0,00		-
3.43	Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	3.450,39	185,92	641.496,51	3.450,39	100,00%	641.496,51				3.450,39	100,00%	641.496,51	0,00	0,00%	-
3.44	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.788,20	197,43	550.473,34	2.788,19	100,00%	550.472,96				2.788,19	100,00%	550.472,96	0,00	0,00%	0,37
4	PAVIMENTAÇÃO				21.634.798,67			17.870.095,35			1.152.121,25			19.022.216,60			2.612.582,08
4.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.405,18	1,87	4.497,68	2.405,18	100,00%	4.497,68				2.405,18	100,00%	4.497,68	0,00	0,00%	-
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre	t	4.509,71	2,17	9.786,06	4.509,71	100,00%	9.786,06				4.509,71	100,00%	9.786,06	0,00	0,00%	-
4.3	Regularização do subleito	m²	37.663,51	1,39	52.352,27	36.435,41	96,74%	50.645,22				36.435,41	96,74%	50.645,22	1.228,09	3,26%	1.707,05
4.4	Reestabilização de camada de base sem adição de material	m³	1.850,14	10,47	19.370,91	1.810,03	97,83%	18.950,97				1.810,03	97,83%	18.950,97	40,11	2,17%	419,93
4.5	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³			-							0,00		-	0,00		-
4.6	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial	m³	740,05	88,23	65.295,04	630,81	85,24%	55.656,45				630,81	85,24%	55.656,45	109,24	14,76%	9.638,59
4.7	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m³	4.440,32	15,96	70.867,43	4.181,88	94,18%	66.742,80	258,42	5,82%	4.124,38	4.440,30	100,00%	70.867,19	0,02	0,00%	0,24
4.8	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m³	2.220,16	72,28	160.473,16	222,02	10,00%	16.047,32	1.998,14	90,00%	144.425,55	2.220,16	100,00%	160.472,87	0,00	0,00%	0,29
4.9	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	5.555,95	14,74	81.894,70	4.494,00	80,89%	66.241,56				4.494,00	80,89%	66.241,56	1.061,95	19,11%	15.653,14
4.10	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²			-							0,00		-	0,00		-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
4.11	Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.728,79	84,84	146.670,54	1.728,79	100,00%	146.670,54	-	-	-	1.728,79	100,00%	146.670,54	0,00	0,00%	-
4.12	Imprimação com asfalto diluído	m²	71.578,39	0,46	32.926,06	70.024,87	97,83%	32.211,44	-	-	-	70.024,87	97,83%	32.211,44	1.553,52	2,17%	714,62
4.13	Pintura de ligação	m²	204.935,38	0,34	69.678,03	185.201,09	90,37%	62.968,37	-	-	-	185.201,09	90,37%	62.968,37	19.734,29	9,63%	6.709,66
4.14	Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	m²	17.266,92	2,25	38.850,57	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	17.266,92	100,00%	38.850,57
4.15	Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial	m²	3.936,23	7,38	29.049,38	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	3.936,23	100,00%	29.049,38
4.16	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	296.576,96	5,27	1.562.960,55	163.019,51	54,97%	859.112,82	40.972,57	13,82%	215.925,44	203.992,08	68,78%	1.075.038,26	92.584,88	31,22%	487.922,29
4.17	Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial	t	1.128,22	213,17	240.502,66	1.128,22	100,00%	240.502,66	-	-	-	1.128,22	100,00%	240.502,66	0,00	0,00%	-
4.18	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	10.940,32	224,33	2.454.241,99	10.940,32	100,00%	2.454.241,51	-	-	-	10.940,32	100,00%	2.454.241,51	0,00	0,00%	0,47
4.19	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial	m³	10.812,44	147,31	1.592.780,54	7.415,51	68,58%	1.092.378,97	-	-	-	7.415,51	68,58%	1.092.378,97	3.396,93	31,42%	500.401,57
4.20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS				13.699.026,42			11.618.631,87			717.447,66			12.336.079,53			1.362.946,89
4.20.1	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	5.553,07	7.339.298,26	1.311,12	99,20%	7.280.720,91	-	-	-	1.311,12	99,20%	7.280.720,91	10,55	0,80%	58.577,35
4.20.2	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	6.564,99	563.899,82	85,90	100,00%	563.899,82	-	-	-	85,90	100,00%	563.899,82	0,00	0,00%	-
4.20.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	3.907,87	421.717,79	70,49	65,32%	275.462,90	-	-	-	70,49	65,32%	275.462,90	37,43	34,68%	146.254,89
4.20.4	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	4.064,95	180.910,60	44,51	100,00%	180.910,60	-	-	-	44,51	100,00%	180.910,60	0,00	0,00%	-
4.20.5	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	5.211,44	5.193.199,96	636,61	63,88%	3.317.637,64	137,67	13,82%	717.447,66	774,27	77,70%	4.035.085,30	222,23	22,30%	1.158.114,66
4.20.6	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
4.21	TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS				1.303.574,71			1.074.809,12			70.198,21			1.145.007,33			158.567,38
4.21.1	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	T	1.321,67	509,91	673.930,20	1.270,34	96,12%	647.761,56	-	-	-	1.270,34	96,12%	647.761,56	51,32	3,88%	26.168,64
4.21.2	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	85,90	509,91	43.798,72	85,90	100,00%	43.798,72	-	-	-	85,90	100,00%	43.798,72	0,00	0,00%	-
4.21.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	T	107,92	509,91	55.026,94	70,49	65,32%	35.943,18	-	-	-	70,49	65,32%	35.943,18	37,43	34,68%	19.083,75
4.21.4	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	T	44,51	509,91	22.693,54	44,51	100,00%	22.693,54	-	-	-	44,51	100,00%	22.693,54	0,00	0,00%	-
4.21.5	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	T	996,50	509,91	508.125,32	636,61	63,88%	324.612,12	137,67	13,82%	70.198,21	774,27	77,70%	394.810,33	222,23	22,30%	113.314,98
4.21.6	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5	DRENAGEM, BUEIROS, OBRAS DE ARTE E PROTEÇÃO AMBIENTAL				1.452.584,21			738.426,79			-			738.426,79			714.157,42
5.1	BUEIROS E OBRAS DE ARTE CORRENTE				495.319,90			495.319,90			-			495.319,90			-
5.1.1	Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.2	Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	19,50	3.054,60	59.564,70	19,50	100,00%	59.564,70	-	-	-	19,50	100,00%	59.564,70	0,00	0,00%	-
5.1.3	Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	3,00	14.191,35	42.574,05	3,00	100,00%	42.574,05	-	-	-	3,00	100,00%	42.574,05	0,00	0,00%	-
5.1.4	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.5	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
5.1.6	Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	13,00	5.083,56	66.086,28	13,00	100,00%	66.086,28	-	-	-	13,00	100,00%	66.086,28	0,00	0,00%	-
5.1.7	Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	16.554,40	33.108,80	2,00	100,00%	33.108,80	-	-	-	2,00	100,00%	33.108,80	0,00	0,00%	-

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.1.8	Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.1.9	Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un			-							0,00			0,00		
5.1.10	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.1.11	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-							0,00			0,00		
5.1.12	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	65,00	1.072,82	69.733,30	65,00	100,00%	69.733,30				65,00	100,00%	69.733,30	0,00	0,00%	-
5.1.13	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	2.347,48	23.474,80	10,00	100,00%	23.474,80				10,00	100,00%	23.474,80	0,00	0,00%	-
5.1.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.1.15	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-							0,00			0,00		
5.1.16	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	2.078,79	54.048,54	26,00	100,00%	54.048,54				26,00	100,00%	54.048,54	0,00	0,00%	-
5.1.17	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	2.818,16	11.272,64	4,00	100,00%	11.272,64				4,00	100,00%	11.272,64	0,00	0,00%	-
5.1.18	Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.1.19	Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-							0,00			0,00		
5.1.20	Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	26,00	3.084,77	80.204,02	26,00	100,00%	80.204,02				26,00	100,00%	80.204,02	0,00	0,00%	-
5.1.21	Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	4,00	3.430,32	13.721,28	4,00	100,00%	13.721,28				4,00	100,00%	13.721,28	0,00	0,00%	-
5.1.22	Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.1.23	Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un			-							0,00			0,00		
5.1.24	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m			-							0,00			0,00		
5.1.25	Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.317,73	17.130,49	13,00	100,00%	17.130,49				13,00	100,00%	17.130,49	0,00	0,00%	-
5.1.26	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação	m	13,00	1.877,00	24.401,00	13,00	100,00%	24.401,00				13,00	100,00%	24.401,00	0,00	0,00%	-
5.2	DRENAGEM SUPERFICIAL, SUBSUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA				957.264,31			243.106,89						243.106,89			714.157,42
5.2.1	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40							0,00	0,00%		622,10	100,00%	83.361,40
5.2.2	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	622,10	134,00	83.361,40							0,00	0,00%		622,10	100,00%	83.361,40
5.2.3	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m			-							0,00			0,00		
5.2.4	Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	654,85	66,16	43.324,55	654,85	100,00%	43.324,55				654,85	100,00%	43.324,55	0,00	0,00%	-
5.2.5	Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m			-							0,00			0,00		



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.2.6	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	1.145,98	72,31	82.865,45			-			-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	82.865,45
5.2.7	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
5.2.8	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	1.145,98	29,36	33.645,83			-			-	0,00	0,00%	-	1.145,98	100,00%	33.645,83
5.2.9	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	17,00	71,61	1.217,37			-			-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.217,37
5.2.10	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	17,00	88,51	1.504,67			-			-	0,00	0,00%	-	17,00	100,00%	1.504,67
5.2.11	Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita comercial	M³	777,63	210,85	163.962,23	525,00	67,51%	110.696,25			-	525,00	67,51%	110.696,25	252,63	32,49%	53.265,98
5.2.12	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	200,66	20.066,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	20.066,00
5.2.13	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	100,00	282,97	28.297,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	28.297,00
5.2.14	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	819,17	81.917,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	81.917,00
5.2.15	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	100,00	338,18	33.818,00			-			-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	33.818,00
5.2.16	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	100,00	1.306,45	130.645,00	8,00	8,00%	10.451,60			-	8,00	8,00%	10.451,60	92,00	92,00%	120.193,40
5.2.17	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	6,50	336,72	2.188,68			-			-	0,00	0,00%	-	6,50	100,00%	2.188,68
5.2.18	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	10,00	579,29	5.792,90			-			-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	5.792,90
5.2.19	Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	7,50	3.508,13	26.310,98			-			-	0,00	0,00%	-	7,50	100,00%	26.310,98
5.2.20	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	4.551,30	4.551,30			-			-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	4.551,30
5.2.21	Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	5.602,30	5.602,30			-			-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	5.602,30
5.2.22	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	555,63	224,67	124.832,27	350,00	62,99%	78.634,50			-	350,00	62,99%	78.634,50	205,63	37,01%	46.197,77
5.2.23	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m			-			-			-	0,00		-	0,00		-
6	OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES				315.329,51			310.987,52			-			310.987,52			4.341,99
6.1	ARMAÇÕES, CONCRETO, FÓRMAS				61.140,69			61.129,07			-			61.129,07			11,61
6.1.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,02	6.973,04	464,25	100,00%	6.973,04			-	464,25	100,00%	6.973,04	0,00	0,00%	-
6.1.2	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	kg	464,25	15,75	7.311,94	464,25	100,00%	7.311,94			-	464,25	100,00%	7.311,94	0,00	0,00%	-
6.1.3	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	7,30	4,11	30,00	7,30	100,00%	30,00			-	7,30	100,00%	30,00	0,00	0,00%	-
6.1.4	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	2,26	549,81	1.242,57	2,26	99,78%	1.239,82			-	2,26	99,78%	1.239,82	0,00	0,22%	2,75
6.1.5	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	11,01	502,36	5.528,47	11,00	99,95%	5.525,96			-	11,00	99,95%	5.525,96	0,01	0,05%	2,51
6.1.6	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	30,95	563,59	17.443,11	30,95	100,00%	17.443,11			-	30,95	100,00%	17.443,11	0,00	0,00%	-
6.1.7	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,48	625,30	9.676,52	15,47	99,97%	9.673,39			-	15,47	99,97%	9.673,39	0,01	0,03%	3,13

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
6.1.8	Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	11,01	548,92	6.040,86	11,00	99,95%	6.038,12	-	-	-	11,00	99,95%	6.038,12	0,01	0,05%	2,74
6.1.9	Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	3,81	82,82	315,54	3,81	100,00%	315,54	-	-	-	3,81	100,00%	315,54	0,00	0,00%	-
6.1.10	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	68,44	96,13	6.578,66	68,43	99,99%	6.578,17	-	-	-	68,43	99,99%	6.578,17	0,00	0,01%	0,48
6.2	CONTENÇÕES				153.169,62			153.169,62						153.169,62			-
6.2.1	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³			-			-				0,00		-	0,00		-
6.2.2	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	367,38	13.997,18	38,10	100,00%	13.997,18	-	-	-	38,10	100,00%	13.997,18	0,00	0,00%	-
6.2.3	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	38,10	553,02	21.070,06	38,10	100,00%	21.070,06	-	-	-	38,10	100,00%	21.070,06	0,00	0,00%	-
6.2.4	Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento	m³	190,50	470,11	89.555,96	190,50	100,00%	89.555,96	-	-	-	190,50	100,00%	89.555,96	0,00	0,00%	-
6.2.5	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	190,50	149,85	28.546,43	190,50	100,00%	28.546,43	-	-	-	190,50	100,00%	28.546,43	0,00	0,00%	-
6.3	DEMOLIÇÕES				3.464,03			3.464,03						3.464,03			-
6.3.1	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	2,60	12,67	32,94	2,60	100,00%	32,94	-	-	-	2,60	100,00%	32,94	0,00	0,00%	-
6.3.2	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	3,90	14,06	54,83	3,90	100,00%	54,83	-	-	-	3,90	100,00%	54,83	0,00	0,00%	-
6.3.3	Demolição manual de concreto simples	m³	2,75	498,68	1.371,37	2,75	100,00%	1.371,37	-	-	-	2,75	100,00%	1.371,37	0,00	0,00%	-
6.3.4	Demolição manual de concreto armado	m³	2,75	729,05	2.004,89	2,75	100,00%	2.004,89	-	-	-	2,75	100,00%	2.004,89	0,00	0,00%	-
6.3.5	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	m²			-			-				0,00		-	0,00		-
6.3.6	Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira	m²			-			-				0,00		-	0,00		-
6.3.7	Demolição de concreto simples com martelo	m³			-			-				0,00		-	0,00		-
6.4	SERVIÇOS AUXILIARES				97.555,18			93.224,81						93.224,81			4.330,37
6.4.1	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	26,20	165,29	4.329,77			-				0,00	0,00%	-	26,20	100,00%	4.329,77
6.4.2	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.728,79	2,07	3.578,60	1.728,78	100,00%	3.578,57	-	-	-	1.728,78	100,00%	3.578,57	0,01	0,00%	0,02
6.4.3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.794,51	20,87	37.451,42	1.794,51	100,00%	37.451,42	-	-	-	1.794,51	100,00%	37.451,42	0,00	0,00%	-
6.4.4	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	16,51	55,12	910,03	16,51	100,00%	910,03	-	-	-	16,51	100,00%	910,03	0,00	0,00%	-
6.4.5	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	272,91	68,89	18.800,43	272,90	100,00%	18.800,08	-	-	-	272,90	100,00%	18.800,08	0,00	0,00%	0,34
6.4.6	Apilamento manual	m³	616,10	40,26	24.803,98	616,09	100,00%	24.803,78	-	-	-	616,09	100,00%	24.803,78	0,00	0,00%	0,20
6.4.7	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	889,00	8,64	7.680,96	889,00	100,00%	7.680,92	-	-	-	889,00	100,00%	7.680,92	0,00	0,00%	0,04
7	MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES				423.987,61			-						-			423.987,61
7.1	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	1.031,98	39,46	40.721,73			-				0,00	0,00%	-	1.031,98	100,00%	40.721,73
7.2	Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	m²	4.191,00	20,50	85.915,50			-				0,00	0,00%	-	4.191,00	100,00%	85.915,50



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
7.3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	580,57	1.451,43							0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.451,43
7.4	Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,50	516,58	1.291,45							0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	1.291,45
7.5	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	815,23	20.380,75							0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	20.380,75
7.6	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	337,43	8.435,75							0,00	0,00%	-	25,00	100,00%	8.435,75
7.7	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	55,00	174,63	9.604,65							0,00	0,00%	-	55,00	100,00%	9.604,65
7.8	Ondulação transversal em concreto - TIPO A - areia e brita comerciais	m²	293,04	498,33	146.030,62							0,00	0,00%	-	293,04	100,00%	146.030,62
7.9	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	440,00	43,84	19.289,60							0,00	0,00%	-	440,00	100,00%	19.289,60
7.10	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	264,00	126,23	33.324,72							0,00	0,00%	-	264,00	100,00%	33.324,72
7.11	Remoção de defesa metálica	m	12,70	29,32	372,36							0,00	0,00%	-	12,70	100,00%	372,36
7.12	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	63,50	900,30	57.169,05							0,00	0,00%	-	63,50	100,00%	57.169,05
8	TRANSPORTE DE MATERIAIS				11.101.584,72			7.223.273,45			1.336.830,74			8.560.104,19			2.541.480,53
8.1	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	263.859,36	1,59	419.536,37	263.800,73	99,98%	419.443,17				263.800,73	99,98%	419.443,17	58,62	0,02%	93,21
8.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	23.720,81	1,27	30.125,43	23.720,80	100,00%	30.125,41				23.720,80	100,00%	30.125,41	0,01	0,00%	0,02
8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.497.126,33	1,04	1.557.011,38	1.431.338,03	95,61%	1.488.591,54				1.431.338,03	95,61%	1.488.591,54	65.788,30	4,39%	68.419,83
8.4	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural	tkm			-			-				0,00		-	0,00		-
8.5	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-				0,00		-	0,00		-
8.6	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada	tkm	67.632,01	0,68	45.989,76	1.798,04	2,66%	1.222,67				1.798,04	2,66%	1.222,67	65.833,97	97,34%	44.767,09
8.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.387.691,39	1,43	1.984.398,69	796.338,91	57,39%	1.138.764,65	360.051,78	25,95%	514.874,04	1.156.390,69	83,33%	1.653.638,69	231.300,70	16,67%	330.759,99
8.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	66.233,00	1,16	76.830,27			-				0,00	0,00%	-	66.233,00	100,00%	76.830,27
8.9	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7.390.311,83	0,93	6.872.990,00	4.457.043,71	60,31%	4.145.050,65	819.809,76	11,09%	762.423,08	5.276.853,47	71,40%	4.907.473,72	2.113.458,36	28,60%	1.965.516,28
8.10	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural	tkm	1.372,63	1,45	1.990,31			-				0,00	0,00%	-	1.372,63	100,00%	1.990,31
8.11	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	252,09	1,16	292,42			-				0,00	0,00%	-	252,09	100,00%	292,42
8.12	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	9.316,00	0,94	8.757,04	80,19	0,86%	75,38				80,19	0,86%	75,38	9.235,81	99,14%	8.681,66
8.13	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	6.631,94	1,33	8.820,47			-				0,00	0,00%	-	6.631,94	100,00%	8.820,47
8.14	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-				0,00		-	0,00		-
8.15	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	25.572,25	0,85	21.736,41			-				0,00	0,00%	-	25.572,25	100,00%	21.736,41



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 08 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 39.036.466,56

CONTRATO Nº: 001/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 30.052.155,45

MEDIÇÃO Nº 08

MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 2.488.951,99

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

SALDO DO CONTRATO: R\$ 6.495.359,12

PERCENTUAL EXECUTADO: 83,36%

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO										
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR								
8.16	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural	tkm	2.306,87	1,21	2.791,31			-			-	0,00	0,00%	-	2.306,87	100,00%	2.791,31								
8.17	Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-								
8.18	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	8.895,12	0,79	7.027,14			-			-	0,00	0,00%	-	8.895,12	100,00%	7.027,14								
8.19	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural	tkm	291,09	3,06	890,74			-			-	0,00	0,00%	-	291,09	100,00%	890,74								
8.20	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-								
8.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.372,29	1,99	2.730,86			-			-	0,00	0,00%	-	1.372,29	100,00%	2.730,86								
8.22	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural	tkm	5.127,40	3,33	17.074,23			-	5.127,40	100,00%	17.074,23	5.127,40	100,00%	17.074,23	0,00	0,00%	-								
8.23	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário	tkm	39,83	2,66	105,93			-			-	0,00	0,00%	-	39,83	100,00%	105,93								
8.24	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	19.657,13	2,16	42.459,39			-	19.657,13	100,00%	42.459,39	19.657,13	100,00%	42.459,39	0,00	0,00%	-								
8.25	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural	tkm	3,36	2,26	7,58			-			-	0,00	0,00%	-	3,36	100,00%	7,58								
8.26	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário	tkm			-			-			-	0,00		-	0,00		-								
8.27	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	12,94	1,47	19,02			-			-	0,00	0,00%	-	12,94	100,00%	19,02								
TOTAL DA PLANILHA R\$					39.036.466,56			76,98%		30.052.155,45			6,38%		2.488.951,99			83,36%		32.541.107,43			16,64%		6.495.359,12

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matrícula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Tupinambá



Rua Tupinambá



Rua Tupinambá



Rua Tupinambá



Rua Tupinambá



Rua Tupinambá



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Sergipe



Rua Sergipe



Rua Sergipe



Rua Sergipe



Rua Sergipe



Rua Sergipe



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua João Pessoa



Rua João Pessoa



Rua João Pessoa



Rua João Pessoa



Rua João Pessoa



Rua João Pessoa



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Paraná




Rua Paraná



Rua Paraná



Rua Paraná

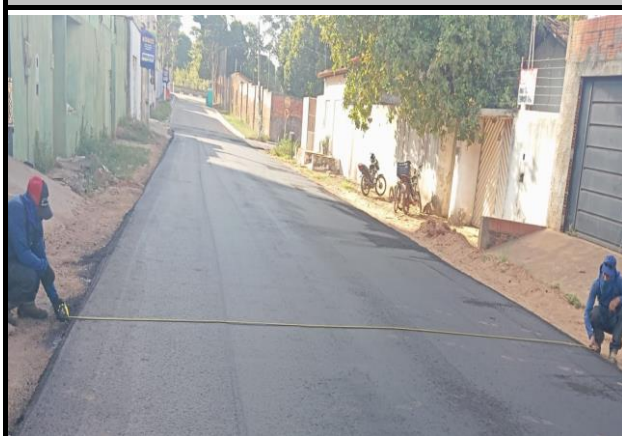

Rua Paraná



Rua Paraná



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Senador Millet



Rua Senador Millet



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



Rua General Gurjão



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Estreita



Rua Estreita



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: nº 001/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: PRAXIS - CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA

MEDIÇÃO 8:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua Coriolano Milhomem



Rua General Gurjão
