



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO: 017/2026
MEDIÇÃO: Nº 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/04/2026 A 18/05/2026

ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026
DATA: 28/05/2026

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 756.090,73
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 842.743,56
SALDO DO CONTRATO: R\$ 7.177.030,86
PERCENTUAL EXECUTADO: 18,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		SALDO				
		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 43.057,85			R\$ 11.943,57			R\$ 0,00			R\$ 11.943,57			R\$ 31.114,29
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	36,00	R\$ 532,52	R\$ 19.170,72	0,00	0,00%	-	-	0,00	0,00%	-	36,00	100,00%			19.170,72
1.2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 23.887,13	R\$ 23.887,13	0,50	50,00%	11.943,57	-	0,50	50,00%	11.943,57	0,50	50,00%			11.943,57
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				R\$ 314.617,80			R\$ 101.448,76			R\$ 55.004,18			R\$ 156.452,94			R\$ 158.164,86
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	288,00	R\$ 213,99	R\$ 61.629,12	80,00	27,78%	17.119,20	60,00	20,83%	12.839,40	140,00	48,61%	29.958,60	148,00	51,39%	31.670,52
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 27.902,79	R\$ 167.416,74	2,00	33,33%	55.805,58	1,00	16,67%	27.902,79	3,00	50,00%	83.708,37	3,00	50,00%	83.708,37
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 6.816,38	R\$ 40.898,28	2,00	33,33%	13.632,76	1,00	16,67%	6.816,38	3,00	50,00%	20.449,14	3,00	50,00%	20.449,14
2.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	R\$ 7.445,61	R\$ 44.673,66	2,00	33,33%	14.891,22	1,00	16,67%	7.445,61	3,00	50,00%	22.336,83	3,00	50,00%	22.336,83
3	TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO				R\$ 3.639.844,73			R\$ 176.344,80			R\$ 342.582,20			R\$ 518.927,00			R\$ 3.120.917,73
3.1	Reconformação da plataforma	m²	427.920,00	R\$ 0,12	R\$ 51.350,40	40.800,00	9,53%	4.896,00	47.950,00	11,21%	5.754,00	88.750,00	20,74%	10.650,00	339.170,00	79,26%	40.700,40
3.2	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	160.470,00	R\$ 0,62	R\$ 99.491,40	6.000,00	3,74%	3.720,00	6.850,00	4,27%	4.247,00	12.850,00	8,01%	7.967,00	147.620,00	91,99%	91.524,40
3.3	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	128.376,00	R\$ 7,92	R\$ 1.016.737,92	4.080,00	3,18%	32.313,60	14.385,00	11,21%	113.929,20	18.465,00	14,38%	146.242,80	109.911,00	85,62%	870.495,12
3.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	261.887,04	R\$ 3,15	R\$ 824.944,18	7.344,00	2,80%	23.133,60	14.385,00	5,49%	45.312,75	21.729,00	8,30%	68.446,35	240.158,04	91,70%	756.497,83
3.5	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	785.661,12	R\$ 0,85	R\$ 667.811,95	95.472,00	12,15%	81.151,20	74.802,00	9,52%	63.581,70	170.274,00	21,67%	144.732,90	615.387,12	78,33%	523.079,05
3.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	128.376,00	R\$ 1,70	R\$ 218.239,20	4.080,00	3,18%	6.936,00	14.385,00	11,21%	24.454,50	18.465,00	14,38%	31.390,50	109.911,00	85,62%	186.848,70
3.7	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	128.376,00	R\$ 5,93	R\$ 761.269,68	4.080,00	3,18%	24.194,40	14.385,00	11,21%	85.303,05	18.465,00	14,38%	109.497,45	109.911,00	85,62%	651.772,23
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO				R\$ 2.326.001,95			R\$ 335.457,60			R\$ 308.738,06			R\$ 644.195,66			R\$ 1.681.806,29
4.1	Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	85.584,00	R\$ 7,92	R\$ 677.825,28	8.160,00	9,53%	64.627,20	14.385,00	16,81%	113.929,20	22.545,00	26,34%	178.556,40	63.039,00	73,66%	499.268,88
4.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	174.591,36	R\$ 3,15	R\$ 549.962,78	14.688,00	8,41%	46.267,20	14.385,00	8,24%	45.312,75	29.073,00	16,65%	91.579,95	145.518,36	83,35%	458.382,83
4.3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanke com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	523.774,08	R\$ 0,85	R\$ 445.207,97	190.944,00	36,46%	162.302,40	46.751,25	8,93%	39.738,56	237.695,25	45,38%	202.040,96	286.078,83	54,62%	243.167,01
4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	85.584,00	R\$ 1,70	R\$ 145.492,80	8.160,00	9,53%	13.872,00	14.385,00	16,81%	24.454,50	22.545,00	26,34%	38.326,50	63.039,00	73,66%	107.166,30
4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	85.584,00	R\$ 5,93	R\$ 507.513,12	8.160,00	9,53%	48.388,80	14.385,00	16,81%	85.303,05	22.545,00	26,34%	133.691,85	63.039,00	73,66%	373.821,27



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO: 017/2026
MEDIÇÃO: Nº 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/04/2026 A 18/05/2026

ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026
DATA: 28/05/2026

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 756.090,73
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 842.743,56
SALDO DO CONTRATO: R\$ 7.177.030,86
PERCENTUAL EXECUTADO: 18,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO		SALDO				
		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR			
5	DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 1.068.088,32	0,00		R\$ 130.896,00			R\$ 136.419,12			R\$ 267.315,12			R\$ 800.773,20
5.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	3.566,00	R\$ 7,92	R\$ 28.242,72	1.800,00	50,48%	14.256,00	411,00	11,53%	3.255,12	2.211,00	62,00%	17.511,12	1.355,00	38,00%	10.731,60
5.2	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica	m	106.980,00	R\$ 9,72	R\$ 1.039.845,60	12.000,00	11,22%	116.640,00	13.700,00	12,81%	133.164,00	25.700,00	24,02%	249.804,00	81.280,00	75,98%	790.041,60
6	OBRAS DE ARTE CORRENTES				R\$ 370.160,77			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 370.160,77
6.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³	201,60	R\$ 9,73	R\$ 1.961,56	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	201,60	100,00%	1.961,56
6.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	m³	151,20	R\$ 20,06	R\$ 3.033,07	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	151,20	100,00%	3.033,07
6.3	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal	m³	151,20	R\$ 6,07	R\$ 917,78	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	151,20	100,00%	917,78
6.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	882,00	R\$ 49,79	R\$ 43.914,78	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	882,00	100,00%	43.914,78
6.5	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	210,00	R\$ 1.046,70	R\$ 219.807,00	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	210,00	100,00%	219.807,00
6.6	Boca de BSTC D = 1,00 m - escuridade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	42,00	R\$ 2.393,49	R\$ 100.526,58	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	42,00	100,00%	100.526,58
7	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA				R\$ 513.684,04			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 513.684,04
7.1	ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	M	120,00	R\$ 501,13	R\$ 60.135,60	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	120,00	100,00%	60.135,60
7.2	TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M	72,00	R\$ 385,84	R\$ 27.780,48	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	72,00	100,00%	27.780,48
7.3	SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	80,00	R\$ 445,77	R\$ 35.661,60	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	80,00	100,00%	35.661,60
7.4	VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M	80,00	R\$ 334,80	R\$ 26.784,00	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	80,00	100,00%	26.784,00
7.5	"PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA	M²	240,00	R\$ 462,94	R\$ 111.105,60	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	240,00	100,00%	111.105,60
7.6	"PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M²	64,00	R\$ 462,94	R\$ 29.628,16	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	64,00	100,00%	29.628,16
7.7	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M²	390,00	R\$ 570,74	R\$ 222.588,60	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	390,00	100,00%	222.588,60
8	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO				R\$ 500.409,69			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 500.409,69
8.1	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	521,28	R\$ 105,65	R\$ 55.073,23	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	521,28	100,00%	55.073,23
8.2	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	1.056,00	R\$ 14,73	R\$ 15.554,88	0,00	0,00%	-			-	0,00	0,00%	-	1.056,00	100,00%	15.554,88



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO: 017/2026
MEDIÇÃO: Nº 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/04/2026 A 18/05/2026

ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026
DATA: 28/05/2026

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 756.090,73
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 842.743,56
SALDO DO CONTRATO: R\$ 7.177.030,86
PERCENTUAL EXECUTADO: 18,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
8.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	33,75	R\$ 49,74	R\$ 1.678,72	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	33,75	100,00%	1.678,72	
8.4	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H	184,80	R\$ 30,74	R\$ 5.680,75	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	184,80	100,00%	5.680,75	
8.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	5,43	R\$ 1.076,16	R\$ 5.843,54	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	5,43	100,00%	5.843,54	
8.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	146,00	R\$ 709,75	R\$ 103.623,50	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	146,00	100,00%	103.623,50	
8.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	109,50	R\$ 388,67	R\$ 42.559,36	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	109,50	100,00%	42.559,36	
8.8	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.701,36	R\$ 14,23	R\$ 152.280,35	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	10.701,36	100,00%	152.280,35	
8.9	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	42,88	R\$ 140,09	R\$ 6.006,35	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	42,88	100,00%	6.006,35	
8.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	172,30	R\$ 10,52	R\$ 1.812,60	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	172,30	100,00%	1.812,60	
8.11	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	129,56	R\$ 95,96	R\$ 12.432,10	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	129,56	100,00%	12.432,10	
8.12	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	15,26	R\$ 992,38	R\$ 15.138,76	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	15,26	100,00%	15.138,76	
8.13	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	63,00	R\$ 125,09	R\$ 7.880,67	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	63,00	100,00%	7.880,67	
8.14	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	un	4,50	R\$ 4.564,07	R\$ 20.538,32	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	4,50	100,00%	20.538,32	
8.15	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	4,50	R\$ 5.849,82	R\$ 26.324,19	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	4,50	100,00%	26.324,19	



BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO: 017/2026
MEDIÇÃO: Nº 03
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/04/2026 A 18/05/2026

ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026
DATA: 28/05/2026


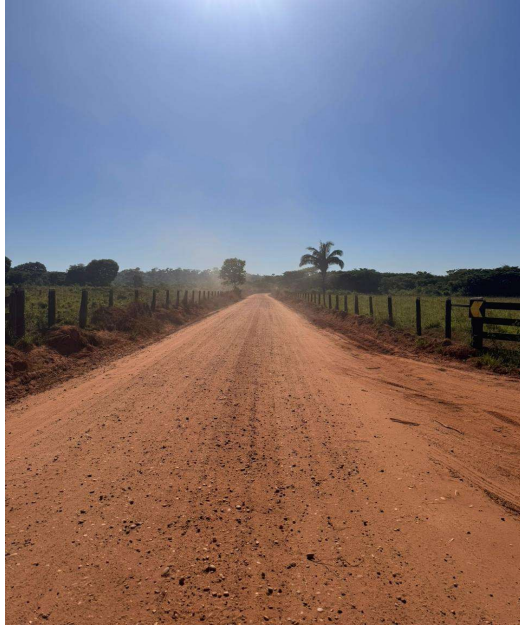

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15
ACUMULADO ANTERIOR: R\$ 756.090,73
MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 842.743,56
SALDO DO CONTRATO: R\$ 7.177.030,86
PERCENTUAL EXECUTADO: 18,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
8.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	36,00	R\$ 614,83	R\$ 22.133,88	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	36,00	100,00%	22.133,88	
8.17	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	64,80	R\$ 31,48	R\$ 2.039,90	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	64,80	100,00%	2.039,90	
8.18	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	6,60	R\$ 101,61	R\$ 670,63	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	6,60	100,00%	670,62	
8.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.868,96	R\$ 1,15	R\$ 2.149,30	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.868,96	100,00%	2.149,29	
8.20	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³	15,26	R\$ 64,81	R\$ 988,68	0,00	0,00%	-	-	-	0,00	0,00%	-	15,26	100,00%	988,68	
TOTAL DA PLANILHA		R\$			R\$ 8.775.865,15		8,62%	756.090,73		9,60%	842.743,56		18,22%	1.598.834,29		81,78%	7.177.030,86

IMPORTA A PRESENTE: MEDIÇÃO Nº 03, O VALOR GLOBAL: R\$ 842.743,56 (oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.775.865,15
CONSTRUTORA: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 842.743,56
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO POVOADO EMBIRAL (TRECHO DA RODOVIA MA-386 AO POVOADO EMBIRAL) EXTENSÃO 6,85KM		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 1.598.834,29
MEDIÇÃO Nº: 03		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 7.177.030,86
CONTRATO: 017/2026	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026	EXECUTADO %:	18,22%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 18/04/2026 A 15/05/2026			
			
Foto 01 Estrada vicinal do Povoado Embiral		Foto 02 Estrada vicinal do Povoado Embiral	
			
Foto 03 Estrada vicinal do Povoado Embiral		Foto 04 Estrada vicinal do Povoado Embiral	



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.775.865,15
CONSTRUTORA: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 842.743,56
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO POVOADO EMBIRAL (TRECHO DA RODOVIA MA-386 AO POVOADO EMBIRAL) EXTENSÃO 6,85KM		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 1.598.834,29
MEDIÇÃO Nº: 03		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 7.177.030,86
CONTRATO: 017/2026	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026	EXECUTADO %:	18,22%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 18/04/2026 A 15/05/2026			
			
Foto 05	Estrada vicinal do Povoado Embiral	Foto 06	Estrada vicinal do Povoado Embiral
			
Foto 07	Estrada vicinal do Povoado Embiral	Foto 08	Estrada vicinal do Povoado Embiral



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.775.865,15
CONSTRUTORA: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 842.743,56
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO POVOADO EMBIRAL (TRECHO DA RODOVIA MA-386 AO POVOADO EMBIRAL)		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 1.598.834,29
EXTENSÃO 6,85KM		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 7.177.030,86
MEDIÇÃO Nº: 03		EXECUTADO %:	18,22%
CONTRATO: 017/2026	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 18/04/2026 A 15/05/2026			



Foto 09 Estrada vicinal do Povoado Embiral



Foto 10 Estrada vicinal do Povoado Embiral



Foto 11 Estrada vicinal do Povoado Embiral

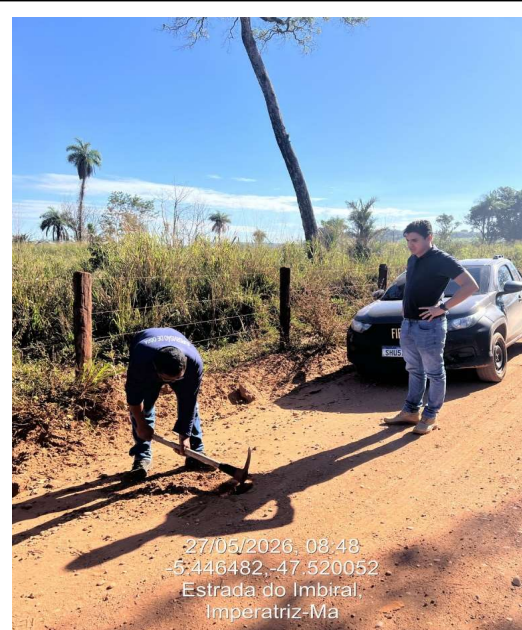


Foto 12 Estrada vicinal do Povoado Embiral



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.775.865,15
CONSTRUTORA: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 842.743,56
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO POVOADO EMBIRAL (TRECHO DA RODOVIA MA-386 AO POVOADO EMBIRAL)		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 1.598.834,29
EXTENSÃO 6,85KM		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 7.177.030,86
MEDIÇÃO Nº: 03		EXECUTADO %:	18,22%
CONTRATO: 017/2026	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 18/04/2026 A 15/05/2026			



27/05/2026, 09:07
 -5.449507, -47.529020
 Estrada do Imbiral,
 Imperatriz-Ma

Foto 13 Estrada vicinal do Povoado Embiral



27/05/2026, 09:36
 -5.460208, -47.560271
 Estrada do Imbiral,
 Imperatriz-Ma

Foto 14 Estrada vicinal do Povoado Embiral



27/05/2026, 08:45
 -5.445601, -47.519789
 Estrada do Imbiral,
 Imperatriz-Ma

Foto 15 Estrada vicinal do Povoado Embiral



27/05/2026, 09:13
 -5.455693, -47.536669
 Estrada do Imbiral,
 Imperatriz-Ma

Foto 16 Estrada vicinal do Povoado Embiral



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ÁREA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - MA		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.775.865,15
CONSTRUTORA: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 842.743,56
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO POVOADO EMBIRAL (TRECHO DA RODOVIA MA-386 AO POVOADO EMBIRAL) EXTENSÃO 6,85KM		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 1.598.834,29
MEDIÇÃO Nº: 03		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 7.177.030,86
CONTRATO: 017/2026	ORDEM DE SERVIÇO Nº: 021/2026	EXECUTADO %:	18,22%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 18/04/2026 A 15/05/2026			
 <p>27/05/2026, 09:18 -5.453280,-47.544094 Estrada do Imbiral, Imperatriz-Ma</p>		 <p>27/05/2026, 08:57 -5.449500,-47.528996 Estrada do Imbiral, Imperatriz-Ma</p>	
Foto 17	Estrada vicinal do Povoado Embiral	Foto 18	Estrada vicinal do Povoado Embiral

HIEL DA SILVA MOTA
FISCAL DO CONTRATO
MATRÍCULA: 32.980-1
