



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO	
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS				228.540,00											
1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	60,00	966,15	57.969,00				9,00	15,00%	8.695,35	9,00	15,00%	8.695,35	51,00	49.273,65
1.2	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.500,00	10,67	16.005,00				470,00	31,33%	5.014,90	470,00	31,33%	5.014,90	1.030,00	10.990,10
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	1.068,65	21.373,00				12,00	60,00%	12.823,80	12,00	60,00%	12.823,80	8,00	8.549,20
1.4	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	250,00	130,70	32.675,00				150,00	60,00%	19.605,00	150,00	60,00%	19.605,00	100,00	13.070,00
1.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	350,00	117,48	41.118,00				160,00	45,71%	18.796,80	160,00	45,71%	18.796,80	190,00	22.321,20
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	10.000,00	4,77	47.700,00				850,00	8,50%	4.054,50	850,00	8,50%	4.054,50	9.150,00	43.645,50
1.7	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	15.000,00	0,78	11.700,00				2.480,00	16,53%	1.934,40	2.480,00	16,53%	1.934,40	12.520,00	9.765,60
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				365.772,00											
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	148,91	196.561,20				550,00	41,67%	81.900,50	550,00	41,67%	81.900,50	770,00	114.660,70
2.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	55,01	72.613,20				550,00	41,67%	30.255,50	550,00	41,67%	30.255,50	770,00	42.357,70
2.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	36,59	96.597,60				980,00	37,12%	35.858,20	980,00	37,12%	35.858,20	1.660,00	60.739,40
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				561.472,95											
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	575,00	60,41	34.735,75				55,00	9,57%	3.322,55	55,00	9,57%	3.322,55	520,00	31.413,20
3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	60,00	607,32	36.439,20				7,00	11,67%	4.251,24	7,00	11,67%	4.251,24	53,00	32.187,96
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5.750,00	24,57	141.277,50				620,00	10,78%	15.233,40	620,00	10,78%	15.233,40	5.130,00	126.044,10
3.4	Demolição de reboco	m²	7.500,00	11,20	84.000,00				490,00	6,53%	5.488,00	490,00	6,53%	5.488,00	7.010,00	78.512,00
3.5	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	400,00	139,52	55.808,00				100,00	25,00%	13.952,00	100,00	25,00%	13.952,00	300,00	41.856,00
3.6	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5.000,00	3,16	15.800,00				150,00	3,00%	474,00	150,00	3,00%	474,00	4.850,00	15.326,00
3.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6.000,00	2,11	12.660,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	6.000,00	12.660,00
3.8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	4.000,00	3,83	15.320,00				475,00	11,88%	1.819,25	475,00	11,88%	1.819,25	3.525,00	13.500,75
3.9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	5.000,00	8,29	41.450,00				600,00	12,00%	4.974,00	600,00	12,00%	4.974,00	4.400,00	36.476,00
3.10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100,00	90,40	9.040,00				12,00	12,00%	1.084,80	12,00	12,00%	1.084,80	88,00	7.955,20
3.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	750,00	10,31	7.732,50				25,00	3,33%	257,75	25,00	3,33%	257,75	725,00	7.474,75
3.12	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	750,00	26,65	19.987,50				20,00	2,67%	533,00	20,00	2,67%	533,00	730,00	19.454,50
3.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	700,00	2,00	1.400,00				78,00	11,14%	156,00	78,00	11,14%	156,00	622,00	1.244,00
3.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1.250,00	0,73	912,50				144,00	11,52%	105,12	144,00	11,52%	105,12	1.106,00	807,38
3.15	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.600,00	0,54	864,00				60,00	3,75%	32,40	60,00	3,75%	32,40	1.540,00	831,60
3.16	REMOÇÃO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	600,00	13,61	8.166,00				15,00	2,50%	204,15	15,00	2,50%	204,15	585,00	7.961,85
3.17	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	1.000,00	35,58	35.580,00				160,00	16,00%	5.692,80	160,00	16,00%	5.692,80	840,00	29.887,20
3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.000,00	4,03	40.300,00				1.400,00	14,00%	5.642,00	1.400,00	14,00%	5.642,00	8.600,00	34.658,00
4	MOVIMENTO DE TERRA				219.178,00											
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1.000,00	88,75	88.750,00				380,00	38,00%	33.725,00	380,00	38,00%	33.725,00	620,00	55.025,00
4.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	800,00	11,86	9.488,00				260,00	32,50%	3.083,60	260,00	32,50%	3.083,60	540,00	6.404,40
4.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1.000,00	94,03	94.030,00				580,00	58,00%	54.537,40	580,00	58,00%	54.537,40	420,00	39.492,60
4.4	ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	500,00	53,82	26.910,00				130,00	26,00%	6.996,60	130,00	26,00%	6.996,60	370,00	19.913,40
5	FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E ESTRUTURAS				1.066.238,90											
5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m³	75,00	997,04	74.778,00				28,00	37,33%	27.917,12	28,00	37,33%	27.917,12	47,00	46.860,88
5.2	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	60,00	731,59	43.895,40				35,00	58,33%	25.605,65	35,00	58,33%	25.605,65	25,00	18.289,75



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

MEDICÇÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	400,00	170,62	68.248,00				210,00	52,50%	35.830,20	210,00	52,50%	35.830,20	190,00	47,50%	32.417,80
5.4	CIVITA DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M	1.000,00	85,72	85.720,00				315,00	31,50%	27.001,80	315,00	31,50%	27.001,80	685,00	68,50%	58.718,20
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.500,00	19,11	47.775,00				1.092,00	43,68%	20.868,12	1.092,00	43,68%	20.868,12	1.408,00	56,32%	26.906,88
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.500,00	18,35	45.875,00				1.540,00	61,60%	28.259,00	1.540,00	61,60%	28.259,00	960,00	38,40%	17.616,00
5.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	1.250,00	16,55	20.687,50				750,00	60,00%	12.412,50	750,00	60,00%	12.412,50	500,00	40,00%	8.275,00
5.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	900,00	17,79	16.011,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	900,00	100,00%	16.011,00
5.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	m³	150,00	1.279,31	191.896,50				52,00	34,67%	66.524,12	52,00	34,67%	66.524,12	98,00	65,33%	125.372,38
5.10	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	m³	150,00	956,42	143.463,00				14,00	9,33%	13.389,88	14,00	9,33%	13.389,88	136,00	90,67%	130.073,12
5.11	GRADITE FCK=30 MPa, TRAÇO 1:0,9:1,2:0,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ (ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2023	m³	50,00	1.021,74	51.087,00				5,60	11,20%	5.721,74	5,60	11,20%	5.721,74	44,40	88,80%	45.365,26
5.12	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	250,00	84,04	21.010,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	100,00%	21.010,00
5.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	400,00	226,65	90.660,00				154,00	38,50%	34.904,10	154,00	38,50%	34.904,10	246,00	61,50%	55.755,90
5.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	m²	400,00	183,65	73.460,00				147,00	36,75%	26.996,55	147,00	36,75%	26.996,55	253,00	63,25%	46.463,45
5.15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF. 11/2020 PA	m²	300,00	256,30	76.890,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	100,00%	76.890,00
5.16	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	125,00	118,26	14.782,50				84,00	67,20%	9.933,84	84,00	67,20%	9.933,84	41,00	32,80%	4.848,66
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E PAINÉIS				977.234,50				0,00		0,00	0,00		0,00			
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	3.000,00	110,52	331.560,00				819,00	27,30%	90.515,88	819,00	27,30%	90.515,88	2.181,00	72,70%	241.044,12
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	250,00	170,62	42.655,00				118,30	47,32%	20.184,35	118,30	47,32%	20.184,35	131,70	52,68%	22.470,65
6.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	700,00	125,65	87.955,00				45,50	6,50%	5.717,08	45,50	6,50%	5.717,08	654,50	93,50%	82.237,93
6.4	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	750,00	72,83	54.622,50				182,00	24,27%	13.255,06	182,00	24,27%	13.255,06	568,00	75,73%	41.367,44
6.5	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	m²	200,00	1.251,15	250.230,00				18,20	9,10%	22.770,93	18,20	9,10%	22.770,93	181,80	90,90%	227.459,07
6.6	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF. 01/2021, PS	m²	150,00	497,47	74.620,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	74.620,50
6.7	DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	200,00	285,94	57.188,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%	57.188,00
6.8	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF. 01/2021	m²	175,00	448,02	78.403,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	175,00	100,00%	78.403,50
7	COBERTURA				2.005.320,50												
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	3.750,00	110,64	414.900,00				1.008,00	26,88%	111.525,12	1.008,00	26,88%	111.525,12	2.742,00	73,12%	303.374,88
7.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	1.250,00	24,81	31.012,50				560,00	44,80%	13.893,60	560,00	44,80%	13.893,60	690,00	55,20%	17.118,90
7.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	1.250,00	58,98	73.725,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.250,00	100,00%	73.725,00
7.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	UN	50,00	1.932,11	96.605,50				21,00	42,00%	40.574,31	21,00	42,00%	40.574,31	29,00	58,00%	56.031,19
7.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF. 07/2019	KG	2.600,00	14,40	37.440,00				11,00	0,42%	158,40	11,00	0,42%	158,40	2.589,00	99,58%	37.281,60
7.6	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	600,00	241,60	144.960,00				84,00	14,00%	20.294,40	84,00	14,00%	20.294,40	516,00	86,00%	124.665,60
7.7	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	3.750,00	24,66	92.475,00				1.330,00	35,47%	32.797,80	1.330,00	35,47%	32.797,80	2.420,00	64,53%	59.677,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
7.8	Retelha em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	17.500,00	14,01	245.175,00				2.100,00	12,00%	29.421,00	2.100,00	12,00%	29.421,00	15.400,00	88,00%	215.754,00
7.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	7.000,00	57,01	399.070,00				1.008,00	14,40%	57.466,08	1.008,00	14,40%	57.466,08	5.992,00	85,60%	341.603,92
7.10	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	750,00	38,16	28.620,00				56,00	7,47%	2.136,96	56,00	7,47%	2.136,96	694,00	92,53%	26.483,04
7.11	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	750,00	95,49	71.617,50				560,00	74,67%	53.474,40	560,00	74,67%	53.474,40	190,00	25,33%	18.143,10
7.12	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF. 07/2019	m²	600,00	92,06	55.236,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	100,00%	55.236,00
7.13	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF. 07/2019	M	2.000,00	30,29	60.580,00				84,00	4,20%	2.544,36	84,00	4,20%	2.544,36	1.916,00	95,80%	58.035,64
7.14	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	875,00	91,68	80.220,00				210,00	24,00%	19.252,80	210,00	24,00%	19.252,80	665,00	76,00%	60.967,20
7.15	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	1.400,00	57,09	79.926,00				105,00	7,50%	5.994,45	105,00	7,50%	5.994,45	1.295,00	92,50%	73.931,55
7.16	Chapim de concreto pré-moldado	m	1.400,00	66,97	93.758,00				112,00	8,00%	7.500,64	112,00	8,00%	7.500,64	1.288,00	92,00%	86.257,36
8	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS				2.327.844,30												
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	60,00	1.323,26	79.395,60				18,00	30,00%	23.818,68	18,00	30,00%	23.818,68	42,00	70,00%	55.576,92
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	87,00	1.391,55	121.064,85				14,00	16,09%	19.481,70	14,00	16,09%	19.481,70	73,00	83,91%	101.583,15
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	60,00	1.527,86	91.671,60				18,00	30,00%	27.501,48	18,00	30,00%	27.501,48	42,00	70,00%	64.170,12
8.4	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	175,00	474,13	82.972,75				13,00	7,43%	6.163,69	13,00	7,43%	6.163,69	162,00	92,57%	76.809,06
8.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	1.750,00	13,55	23.712,50				180,00	10,29%	2.439,00	180,00	10,29%	2.439,00	1.570,00	89,71%	21.273,50
8.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	125,00	503,26	62.907,50				8,00	6,40%	4.026,08	8,00	6,40%	4.026,08	117,00	93,60%	58.881,42
8.7	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	75,00	511,98	38.398,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	38.398,50
8.8	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	175,00	549,81	96.216,75				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	175,00	100,00%	96.216,75
8.9	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	175,00	683,42	119.598,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	175,00	100,00%	119.598,50
8.10	Revisão de esquadria de madeira	m²	275,00	133,13	36.610,75				35,00	12,73%	4.659,55	35,00	12,73%	4.659,55	240,00	87,27%	31.951,20
8.11	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019	m²	100,00	885,47	88.547,00				8,00	8,00%	7.083,76	8,00	8,00%	7.083,76	92,00	92,00%	81.463,24
8.12	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	150,00	620,16	93.024,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	93.024,00
8.13	Revisão de esquadria de ferro	m²	300,00	166,16	49.848,00				15,00	5,00%	2.492,40	15,00	5,00%	2.492,40	285,00	95,00%	47.355,60
8.14	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	175,00	857,45	150.053,75				4,50	2,57%	3.858,53	4,50	2,57%	3.858,53	170,50	97,43%	146.195,23
8.15	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	UN	25,00	2.386,37	59.659,25				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	25,00	100,00%	59.659,25
8.16	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	350,00	204,34	71.519,00				62,00	17,71%	12.669,08	62,00	17,71%	12.669,08	288,00	82,29%	58.849,92
8.17	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	100,00	425,96	42.596,00				4,00	4,00%	1.703,84	4,00	4,00%	1.703,84	96,00	96,00%	40.892,16
8.18	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	250,00	480,48	120.120,00				25,00	10,00%	12.012,00	25,00	10,00%	12.012,00	225,00	90,00%	108.108,00
8.19	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	250,00	535,32	133.830,00				14,00	5,60%	7.494,48	14,00	5,60%	7.494,48	236,00	94,40%	126.335,52



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
8.20	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	87,50	903,16	79.026,50				13,00	14,86%	11.741,08	13,00	14,86%	11.741,08	74,50	85,14%	67.285,42
8.21	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALÍPTO OU EQUIV.) DE ABIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO C/ PARAFUSO E ESPUMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	50,00	795,94	39.797,00				8,00	16,00%	6.367,52	8,00	16,00%	6.367,52	42,00	84,00%	33.429,48
8.22	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m²	125,00	856,31	107.038,75				8,00	6,40%	6.850,48	8,00	6,40%	6.850,48	117,00	93,60%	100.188,27
8.23	Grade em metalon	m²	350,00	399,11	139.688,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	350,00	100,00%	139.688,50
8.24	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021 PS	m²	300,00	385,69	115.707,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	100,00%	115.707,00
8.25	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 PS	m²	250,00	399,14	99.785,00				24,00	9,60%	9.579,36	24,00	9,60%	9.579,36	226,00	90,40%	90.205,64
8.26	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 PS	m²	100,00	532,24	53.224,00				18,00	18,00%	9.580,32	18,00	18,00%	9.580,32	82,00	82,00%	43.643,68
8.27	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	M	125,00	586,53	73.316,25				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	125,00	100,00%	73.316,25
8.28	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	250,00	234,06	58.515,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	100,00%	58.515,00
9	PAVIMENTAÇÃO				2.986.541,00												
9.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	2.600,00	61,33	159.458,00				815,00	31,35%	49.983,95	815,00	31,35%	49.983,95	1.785,00	68,65%	109.474,05
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	m²	250,00	1.011,36	252.840,00				165,00	66,00%	166.874,40	165,00	66,00%	166.874,40	85,00	34,00%	85.965,60
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	750,00	100,73	75.547,50				575,00	76,67%	57.919,75	575,00	76,67%	57.919,75	175,00	23,33%	17.627,75
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	1.250,00	122,55	153.187,50				388,00	31,04%	47.549,40	388,00	31,04%	47.549,40	862,00	68,96%	105.638,10
9.5	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	2.500,00	54,42	136.050,00				692,00	27,68%	37.658,64	692,00	27,68%	37.658,64	1.808,00	72,32%	98.391,36
9.6	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	2.500,00	46,86	117.150,00				692,00	27,68%	32.427,12	692,00	27,68%	32.427,12	1.808,00	72,32%	84.722,88
9.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X8X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	400,00	52,88	21.152,00				295,00	73,75%	15.599,60	295,00	73,75%	15.599,60	105,00	26,25%	5.552,40
9.8	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	600,00	51,33	30.798,00				295,00	49,17%	15.142,35	295,00	49,17%	15.142,35	305,00	50,83%	15.655,65
9.9	Colchão de areia	m³	200,00	165,27	33.054,00				94,00	47,00%	15.535,38	94,00	47,00%	15.535,38	106,00	53,00%	17.518,62
9.10	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	1.750,00	87,61	153.317,50				940,00	53,71%	82.353,40	940,00	53,71%	82.353,40	810,00	46,29%	70.964,10
9.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	500,00	83,41	41.705,00				500,00	100,00%	41.705,00	500,00	100,00%	41.705,00	0,00	0,00%	0,00
9.12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	1.000,00	98,19	98.190,00				195,00	19,50%	19.147,05	195,00	19,50%	19.147,05	805,00	80,50%	79.042,95
9.13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF. 10/2022	m²	250,00	127,10	31.775,00				65,00	26,00%	8.261,50	65,00	26,00%	8.261,50	185,00	74,00%	23.513,50
9.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²	3.000,00	55,92	167.760,00				832,00	27,73%	46.525,44	832,00	27,73%	46.525,44	2.168,00	72,27%	121.234,56
9.15	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	m²	3.000,00	83,51	250.530,00				832,00	27,73%	69.480,32	832,00	27,73%	69.480,32	2.168,00	72,27%	181.049,68
9.16	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	m²	1.500,00	89,59	134.385,00				390,00	26,00%	34.940,10	390,00	26,00%	34.940,10	1.110,00	74,00%	99.444,90
9.17	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF. 02/2023 PE	m²	750,00	174,07	130.552,50				195,00	26,00%	33.943,65	195,00	26,00%	33.943,65	555,00	74,00%	96.608,85
9.18	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 02/2023	M	1.750,00	10,87	19.022,50				455,00	26,00%	4.945,85	455,00	26,00%	4.945,85	1.295,00	74,00%	14.076,65



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÇÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
9.19	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 02/2023	M	1.000,00	12,46	12.460,00				260,00	26,00%	3.239,60	260,00	26,00%	3.239,60	740,00	74,00%	9.220,40
9.20	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF. 02/2023	M	500,00	17,27	8.635,00				130,00	26,00%	2.245,10	130,00	26,00%	2.245,10	370,00	74,00%	6.389,90
9.21	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	350,00	161,50	56.525,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	350,00	100,00%	56.525,00
9.22	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF. 09/2020	m²	200,00	164,67	32.934,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%	32.934,00
9.23	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF. 09/2020	m²	200,00	136,38	27.276,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	200,00	100,00%	27.276,00
9.24	PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF. 09/2020	m²	100,00	372,31	37.231,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	37.231,00
9.25	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	400,00	233,87	93.548,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	400,00	100,00%	93.548,00
9.26	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 10cm, tela simples soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm	m²	3.250,00	218,91	711.457,50				576,00	17,72%	126.092,16	576,00	17,72%	126.092,16	2.674,00	82,28%	585.365,34
10	REVESTIMENTOS				1.780.177,00												
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	12.000,00	9,89	118.680,00				1.645,00	13,71%	16.269,05	1.645,00	13,71%	16.269,05	10.355,00	86,29%	102.410,95
10.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	10.000,00	47,19	471.900,00				1.380,00	13,80%	65.122,20	1.380,00	13,80%	65.122,20	8.620,00	86,20%	406.777,80
10.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	m²	9.000,00	47,54	427.860,00				350,00	3,89%	16.639,00	350,00	3,89%	16.639,00	8.650,00	96,11%	411.221,00
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF. 03/2023	m²	400,00	49,78	19.912,00				45,00	11,25%	2.240,10	45,00	11,25%	2.240,10	355,00	88,75%	17.671,90
10.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, TecnoGres, linha Brilhante, ref. BR1060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 04	m²	500,00	106,84	53.420,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%	53.420,00
10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m²	4.000,00	84,40	337.600,00				125,00	3,13%	10.550,00	125,00	3,13%	10.550,00	3.875,00	96,88%	327.050,00
10.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	m²	3.500,00	100,23	350.805,00				75,00	2,14%	7.517,25	75,00	2,14%	7.517,25	3.425,00	97,86%	343.287,75
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.869.886,25												
11.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO ISEM LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF. 11/2022	UN	600,00	210,32	126.192,00				94,00	15,67%	19.770,08	94,00	15,67%	19.770,08	506,00	84,33%	106.421,92
11.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UN	600,00	181,62	108.972,00				126,00	21,00%	22.884,12	126,00	21,00%	22.884,12	474,00	79,00%	86.087,88
11.3	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	M	2.500,00	10,02	25.050,00				245,00	9,80%	2.454,90	245,00	9,80%	2.454,90	2.255,00	90,20%	22.595,10
11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 PA	M	7.500,00	24,08	180.600,00				2.145,00	28,60%	51.651,60	2.145,00	28,60%	51.651,60	5.355,00	71,40%	128.948,40
11.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	500,00	24,10	12.050,00				250,00	50,00%	6.025,00	250,00	50,00%	6.025,00	250,00	50,00%	6.025,00
11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15.000,00	3,95	59.250,00				100,00	0,67%	395,00	100,00	0,67%	395,00	14.900,00	99,33%	58.855,00
11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	25.000,00	5,80	145.000,00				6.800,00	27,20%	39.440,00	6.800,00	27,20%	39.440,00	18.200,00	72,80%	105.560,00
11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	15.000,00	9,01	135.150,00				3.200,00	21,33%	28.832,00	3.200,00	21,33%	28.832,00	11.800,00	78,67%	106.318,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2.250,00	22,78	51.255,00				600,00	26,67%	13.668,00	600,00	26,67%	13.668,00	1.650,00	73,33%	37.587,00
11.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	600,00	32,92	19.752,00				60,00	10,00%	1.975,20	60,00	10,00%	1.975,20	540,00	90,00%	17.776,80
11.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,00	127,78	19.167,00				4,00	2,67%	511,12	4,00	2,67%	511,12	146,00	97,33%	18.655,88
11.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,00	441,02	66.153,00				2,00	1,33%	882,04	2,00	1,33%	882,04	148,00	98,67%	65.270,96



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
11.13	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	50,00	606,57	30.328,50				1,00	2,00%	606,57	1,00	2,00%	606,57	49,00	98,00%	29.721,93
11.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	250,00	13,86	3.465,00				30,00	12,00%	415,80	30,00	12,00%	415,80	220,00	88,00%	3.049,20
11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	250,00	16,21	4.052,50				32,00	12,80%	518,72	32,00	12,80%	518,72	218,00	87,20%	3.533,78
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,00	26,03	3.904,50				5,00	3,33%	130,15	5,00	3,33%	130,15	145,00	96,67%	3.774,35
11.17	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	100,00	67,95	6.795,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	6.795,00
11.18	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	100,00	74,89	7.489,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	7.489,00
11.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,00	107,66	16.149,00				18,00	12,00%	1.937,88	18,00	12,00%	1.937,88	132,00	88,00%	14.211,12
11.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	125,00	186,90	23.362,50				4,00	3,20%	747,60	4,00	3,20%	747,60	121,00	96,80%	22.614,90
11.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	750,00	36,21	27.157,50				25,00	3,33%	905,25	25,00	3,33%	905,25	725,00	96,67%	26.252,25
11.22	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	100,00	56,11	5.611,00				10,00	10,00%	561,10	10,00	10,00%	561,10	90,00	90,00%	5.049,90
11.23	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	150,00	94,86	14.229,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	150,00	100,00%	14.229,00
11.24	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1.500,00	54,81	82.215,00				34,00	2,27%	1.863,54	34,00	2,27%	1.863,54	1.466,00	97,73%	80.351,46
11.25	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	500,00	57,46	28.730,00				5,00	1,00%	287,30	5,00	1,00%	287,30	495,00	99,00%	28.442,70
11.26	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	200,00	56,28	11.256,00				2,00	1,00%	112,56	2,00	1,00%	112,56	198,00	99,00%	11.143,44
11.27	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	1.500,00	11,33	16.995,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.500,00	100,00%	16.995,00
11.28	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2.500,00	16,24	40.600,00				180,00	7,20%	2.923,20	180,00	7,20%	2.923,20	2.320,00	92,80%	37.676,80
11.29	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca Llum. ou similar	un	1.750,00	43,28	75.740,00				50,00	2,86%	2.164,00	50,00	2,86%	2.164,00	1.700,00	97,14%	73.576,00
11.30	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024 PS	UN	1.250,00	35,18	43.975,00				40,00	3,20%	1.407,20	40,00	3,20%	1.407,20	1.210,00	96,80%	42.567,80
11.31	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	1.750,00	35,63	62.352,50				44,00	2,51%	1.567,72	44,00	2,51%	1.567,72	1.706,00	97,49%	60.784,78
11.32	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	1.750,00	86,76	151.830,00				10,00	0,57%	867,60	10,00	0,57%	867,60	1.740,00	99,43%	150.962,40
11.33	Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt	un	750,00	70,52	52.890,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	750,00	100,00%	52.890,00
11.34	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	250,00	131,30	32.825,00				25,00	10,00%	3.282,50	25,00	10,00%	3.282,50	225,00	90,00%	29.542,50
11.35	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	350,00	70,81	24.783,50				4,00	1,14%	283,24	4,00	1,14%	283,24	346,00	98,86%	24.500,26
11.36	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	350,00	46,34	16.219,00				20,00	5,71%	926,80	20,00	5,71%	926,80	330,00	94,29%	15.292,20
11.37	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2020	UN	100,00	465,96	46.596,00				27,00	27,00%	12.580,92	27,00	27,00%	12.580,92	73,00	73,00%	34.015,08
11.38	Pára-raio tipo Franklin 350mm, lãdo cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra. Inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	50,00	984,98	49.249,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	50,00	100,00%	49.249,00
11.39	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	275,00	154,53	42.495,75				27,00	9,82%	4.172,31	27,00	9,82%	4.172,31	248,00	90,18%	38.323,44
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1.971.824,86												
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	175,00	158,15	27.676,25				18,00	10,29%	2.846,70	18,00	10,29%	2.846,70	157,00	89,71%	24.829,55
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.750,00	12,43	21.752,50				150,00	8,57%	1.864,50	150,00	8,57%	1.864,50	1.600,00	91,43%	19.888,00
12.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1.500,00	14,27	21.405,00				100,00	6,67%	1.427,00	100,00	6,67%	1.427,00	1.400,00	93,33%	19.978,00
12.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	500,00	22,29	11.145,00				125,00	25,00%	2.786,25	125,00	25,00%	2.786,25	375,00	75,00%	8.358,75
12.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	300,00	22,15	6.645,00				40,00	13,33%	886,00	40,00	13,33%	886,00	260,00	86,67%	5.759,00
12.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80,00	6,41	512,80				10,00	12,50%	64,10	10,00	12,50%	64,10	70,00	87,50%	448,70
12.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	150,00	21,80	3.270,00				6,00	4,00%	130,80	6,00	4,00%	130,80	144,00	96,00%	3.139,20



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
12.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	80,00	7,47	597,60				7,00	8,75%	52,29	7,00	8,75%	52,29	73,00	91,25%	545,31
12.9	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	90,00	23,39	2.105,10				6,00	6,67%	140,34	6,00	6,67%	140,34	84,00	93,33%	1.964,76
12.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	90,00	28,49	2.564,10				1,00	1,11%	28,49	1,00	1,11%	28,49	89,00	98,89%	2.535,61
12.11	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	45,00	43,61	1.962,45				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	45,00	100,00%	1.962,45
12.12	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	30,00	42,53	1.275,90				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	100,00%	1.275,90
12.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	35,00	67,93	2.377,55				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	100,00%	2.377,55
12.14	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	35,00	281,16	9.840,60				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	35,00	100,00%	9.840,60
12.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	350,00	10,80	3.780,00				10,00	2,86%	108,00	10,00	2,86%	108,00	340,00	97,14%	3.672,00
12.16	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	350,00	13,44	4.704,00				15,00	4,29%	201,60	15,00	4,29%	201,60	335,00	95,71%	4.502,40
12.17	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	25,00	19,86	496,50				12,00	48,00%	238,32	12,00	48,00%	238,32	13,00	52,00%	258,18
12.18	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	25,00	22,99	574,75				6,00	24,00%	137,94	6,00	24,00%	137,94	19,00	76,00%	436,81
12.19	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	30,00	26,60	798,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	100,00%	798,00
12.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	250,00	8,91	2.227,50				4,00	1,60%	35,64	4,00	1,60%	35,64	246,00	98,40%	2.191,86
12.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	250,00	10,61	2.652,50				12,00	4,80%	127,32	12,00	4,80%	127,32	238,00	95,20%	2.525,18
12.22	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	14,81	547,97				11,00	29,73%	162,91	11,00	29,73%	162,91	26,00	70,27%	385,06
12.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	15,32	566,84				15,00	40,54%	229,80	15,00	40,54%	229,80	22,00	59,46%	337,04
12.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	16,51	610,87				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	37,00	100,00%	610,87
12.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	37,00	123,65	4.575,05				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	37,00	100,00%	4.575,05
12.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	250,00	12,40	3.100,00				5,00	2,00%	62,00	5,00	2,00%	62,00	245,00	98,00%	3.038,00
12.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	250,00	14,64	3.660,00				8,00	3,20%	117,12	8,00	3,20%	117,12	242,00	96,80%	3.542,88
12.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	50,00	20,74	1.037,00				8,00	16,00%	165,92	8,00	16,00%	165,92	42,00	84,00%	871,08
12.29	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	400,00	6,22	2.488,00				6,00	1,50%	37,32	6,00	1,50%	37,32	394,00	98,50%	2.450,68
12.30	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2024	UN	400,00	4,40	1.760,00				12,00	3,00%	52,80	12,00	3,00%	52,80	388,00	97,00%	1.707,20
12.31	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	150,00	10,96	1.644,00				20,00	13,33%	219,20	20,00	13,33%	219,20	130,00	86,67%	1.424,80
12.32	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO X", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	150,00	52,40	7.860,00				4,00	2,67%	209,60	4,00	2,67%	209,60	146,00	97,33%	7.650,40
12.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	150,00	33,64	5.046,00				4,00	2,67%	134,56	4,00	2,67%	134,56	146,00	97,33%	4.911,44
12.34	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	75,00	77,67	5.825,25				3,00	4,00%	233,01	3,00	4,00%	233,01	72,00	96,00%	5.592,24
12.35	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	150,00	37,46	5.619,00				2,00	1,33%	74,92	2,00	1,33%	74,92	148,00	98,67%	5.544,08
12.36	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	75,00	88,47	6.635,25				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	6.635,25
12.37	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	75,00	25,04	1.878,00				10,00	13,33%	250,40	10,00	13,33%	250,40	65,00	86,67%	1.627,60
12.38	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	75,00	31,27	2.345,25				8,00	10,67%	250,16	8,00	10,67%	250,16	67,00	89,33%	2.095,09



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRAS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
12.39	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	50,00	1.061,20	53.060,00				2,00	4,00%	2.122,40	2,00	4,00%	2.122,40	48,00	96,00%	50.937,60
12.40	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	10,00	3.557,51	35.575,10				1,00	10,00%	3.557,51	1,00	10,00%	3.557,51	9,00	90,00%	32.017,59
12.41	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	750,00	13,53	10.147,50				10,00	1,33%	135,30	10,00	1,33%	135,30	740,00	98,67%	10.012,20
12.42	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	750,00	15,54	11.655,00				4,00	0,53%	62,16	4,00	0,53%	62,16	746,00	99,47%	11.592,84
12.43	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	60,00	38,53	2.311,80				3,00	5,00%	115,59	3,00	5,00%	115,59	57,00	95,00%	2.196,21
12.44	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	60,00	44,71	2.682,60				5,00	8,33%	223,55	5,00	8,33%	223,55	55,00	91,67%	2.459,05
12.45	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	500,00	90,28	45.140,00				25,00	5,00%	2.257,00	25,00	5,00%	2.257,00	475,00	95,00%	42.883,00
12.46	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	500,00	132,89	66.445,00				15,00	3,00%	1.993,35	15,00	3,00%	1.993,35	485,00	97,00%	64.451,65
12.47	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	500,00	120,53	60.265,00				40,00	8,00%	4.821,20	40,00	8,00%	4.821,20	460,00	92,00%	55.443,80
12.48	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	500,00	23,87	11.935,00				60,00	12,00%	1.432,20	60,00	12,00%	1.432,20	440,00	88,00%	10.502,80
12.49	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1.600,00	30,27	48.432,00				54,00	3,38%	1.634,58	54,00	3,38%	1.634,58	1.546,00	96,63%	46.797,42
12.50	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	250,00	37,75	9.437,50				30,00	12,00%	1.132,50	30,00	12,00%	1.132,50	220,00	88,00%	8.305,00
12.51	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	1.600,00	42,17	67.472,00				4,00	0,25%	168,68	4,00	0,25%	168,68	1.596,00	99,75%	67.303,32
12.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	11,45	2.862,50				2,00	0,80%	22,90	2,00	0,80%	22,90	248,00	99,20%	2.839,60
12.53	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	17,51	4.377,50				2,00	0,80%	35,02	2,00	0,80%	35,02	248,00	99,20%	4.342,48
12.54	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	100,00	26,52	2.652,00				1,00	1,00%	26,52	1,00	1,00%	26,52	99,00	99,00%	2.625,48
12.55	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	32,30	8.075,00				2,00	0,80%	64,60	2,00	0,80%	64,60	248,00	99,20%	8.010,40
12.56	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	16,60	4.150,00				1,00	0,40%	16,60	1,00	0,40%	16,60	249,00	99,60%	4.133,40
12.57	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	28,32	7.080,00				3,00	1,20%	84,96	3,00	1,20%	84,96	247,00	98,80%	6.995,04
12.58	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	100,00	45,24	4.524,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	4.524,00
12.59	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	50,66	12.665,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	100,00%	12.665,00
12.60	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	16,72	4.180,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	100,00%	4.180,00
12.61	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	30,96	7.740,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	250,00	100,00%	7.740,00
12.62	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	100,00	47,57	4.757,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	4.757,00
12.63	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	250,00	59,69	14.922,50				5,00	2,00%	298,45	5,00	2,00%	298,45	245,00	98,00%	14.624,05
12.64	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	150,00	22,24	3.336,00				4,00	2,67%	88,96	4,00	2,67%	88,96	146,00	97,33%	3.247,04
12.65	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	75,00	25,54	1.915,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	1.915,50
12.66	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	100,00	58,71	5.871,00				8,00	8,00%	469,68	8,00	8,00%	469,68	92,00	92,00%	5.401,32



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDIDAÇÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
12.67	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	50,00	294,75	14.737,50				6,00	12,00%	1.768,50	6,00	12,00%	1.768,50	44,00	88,00%	12.969,00
12.68	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	37,00	550,08	20.352,96				2,00	5,41%	1.100,16	2,00	5,41%	1.100,16	35,00	94,59%	19.252,80
12.69	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UN	50,00	335,62	16.781,00				10,00	20,00%	3.356,20	10,00	20,00%	3.356,20	40,00	80,00%	13.424,80
12.70	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 PA	UN	35,00	2.920,76	102.226,60				4,00	11,43%	11.683,04	4,00	11,43%	11.683,04	31,00	88,57%	90.543,56
12.71	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 PA	UN	35,00	4.361,30	152.645,50				4,00	11,43%	17.445,20	4,00	11,43%	17.445,20	31,00	88,57%	135.200,30
12.72	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	300,00	695,49	208.647,00				10,00	3,33%	6.954,90	10,00	3,33%	6.954,90	290,00	96,67%	201.692,10
12.73	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	50,00	1.096,55	54.827,50				2,00	4,00%	2.193,10	2,00	4,00%	2.193,10	48,00	96,00%	52.634,40
12.74	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	350,00	48,80	17.080,00				12,00	3,43%	585,60	12,00	3,43%	585,60	338,00	96,57%	16.494,40
12.75	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	50,00	979,25	48.962,50				4,00	8,00%	3.917,00	4,00	8,00%	3.917,00	46,00	92,00%	45.045,50
12.76	Mictório coletivo aço inox (aísi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	m	25,00	971,70	24.292,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	25,00	100,00%	24.292,50
12.77	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	300,00	385,50	115.650,00				6,00	2,00%	2.313,00	6,00	2,00%	2.313,00	294,00	98,00%	113.337,00
12.78	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	100,00	419,64	41.964,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	41.964,00
12.79	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	75,00	512,38	38.428,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	38.428,50
12.80	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	75,00	1.708,78	128.158,50				10,00	13,33%	17.087,80	10,00	13,33%	17.087,80	65,00	86,67%	111.070,70
12.81	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamentoliso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão,válvula e torneira	m	18,25	1.602,27	29.241,43				2,00	10,96%	3.204,54	2,00	10,96%	3.204,54	16,25	89,04%	26.036,89
12.82	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	150,00	203,32	30.498,00				10,00	6,67%	2.033,20	10,00	6,67%	2.033,20	140,00	93,33%	28.464,80
12.83	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	75,00	280,58	21.043,50				2,00	2,67%	561,16	2,00	2,67%	561,16	73,00	97,33%	20.482,34
12.84	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	400,00	12,26	4.904,00				4,00	1,00%	49,04	4,00	1,00%	49,04	396,00	99,00%	4.854,96
12.85	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	350,00	16,06	5.621,00				14,00	4,00%	224,84	14,00	4,00%	224,84	336,00	96,00%	5.396,16
12.86	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	75,00	29,78	2.233,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	2.233,50
12.87	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	300,00	262,87	78.861,00				14,00	4,67%	3.680,18	14,00	4,67%	3.680,18	286,00	95,33%	75.180,82
12.88	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	200,00	234,07	46.814,00				10,00	5,00%	2.340,70	10,00	5,00%	2.340,70	190,00	95,00%	44.473,30
12.89	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	125,00	178,51	22.313,75				5,00	4,00%	892,55	5,00	4,00%	892,55	120,00	96,00%	21.421,20
12.90	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	87,00	101,63	8.841,81				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	87,00	100,00%	8.841,81
12.91	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	75,00	137,65	10.323,75				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	75,00	100,00%	10.323,75
12.92	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	100,00	103,95	10.395,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00	100,00%	10.395,00
12.93	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	87,00	133,32	11.598,84				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	87,00	100,00%	11.598,84
12.94	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	87,00	82,22	7.153,14				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	87,00	100,00%	7.153,14
13	IMPERMEABILIZAÇÕES				424.388,00												
13.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	m²	1.000,00	45,13	45.130,00				240,00	24,00%	10.831,20	240,00	24,00%	10.831,20	760,00	76,00%	34.298,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CONTRATO Nº: 32/2026 - SINFRA

JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.

LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

MEDICÃO Nº 1ª

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026

DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDICÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
13.2	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m²	500,00	53,21	26.605,00				125,00	25,00%	6.651,25	125,00	25,00%	6.651,25	375,00	75,00%	19.953,75
13.3	Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m²	2.000,00	44,13	88.260,00				235,00	11,75%	10.370,55	235,00	11,75%	10.370,55	1.765,00	88,25%	77.889,45
13.4	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoiflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	1.500,00	72,97	109.455,00				140,00	9,33%	10.215,80	140,00	9,33%	10.215,80	1.360,00	90,67%	99.239,20
13.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	600,00	258,23	154.938,00				15,00	2,50%	3.873,45	15,00	2,50%	3.873,45	585,00	97,50%	151.064,55
14	PINTURA				2.706.122,00												
14.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	15.750,00	4,28	67.410,00				5.390,00	34,22%	23.069,20	5.390,00	34,22%	23.069,20	10.360,00	65,78%	44.340,80
14.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	15.750,00	18,39	289.642,50				4.950,00	31,43%	91.030,50	4.950,00	31,43%	91.030,50	10.800,00	68,57%	198.612,00
14.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	5.750,00	32,65	187.737,50				1.210,00	21,04%	39.506,50	1.210,00	21,04%	39.506,50	4.540,00	78,96%	148.231,00
14.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17.500,00	13,06	228.550,00				375,00	2,14%	4.897,50	375,00	2,14%	4.897,50	17.125,00	97,86%	223.652,50
14.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	17.500,00	15,96	279.300,00				7.480,00	42,74%	119.380,80	7.480,00	42,74%	119.380,80	10.020,00	57,26%	159.919,20
14.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7.500,00	18,35	137.625,00				1.650,00	22,00%	30.277,50	1.650,00	22,00%	30.277,50	5.850,00	78,00%	107.347,50
14.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	m²	10.000,00	29,39	293.900,00				214,50	2,15%	6.304,16	214,50	2,15%	6.304,16	9.785,50	97,86%	287.595,85
14.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	7.500,00	17,67	132.525,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.500,00	100,00%	132.525,00
14.9	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1.350,00	23,97	32.359,50				176,00	13,04%	4.218,72	176,00	13,04%	4.218,72	1.174,00	86,96%	28.140,78
14.10	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	9.500,00	18,35	174.325,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	9.500,00	100,00%	174.325,00
14.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1.750,00	52,91	92.592,50				231,00	13,20%	12.222,21	231,00	13,20%	12.222,21	1.519,00	86,80%	80.370,29
14.12	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	4.500,00	54,60	245.700,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	4.500,00	100,00%	245.700,00
14.13	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	3.250,00	73,62	239.265,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.250,00	100,00%	239.265,00
14.14	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	9.000,00	25,57	230.130,00				1.045,00	11,61%	26.720,65	1.045,00	11,61%	26.720,65	7.955,00	88,39%	203.409,35
14.15	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	3.000,00	11,61	34.830,00				110,00	3,67%	1.277,10	110,00	3,67%	1.277,10	2.890,00	96,33%	33.552,90
14.16	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	3.000,00	10,56	31.680,00				49,50	1,65%	522,72	49,50	1,65%	522,72	2.950,50	98,35%	31.157,28
14.17	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	5.000,00	1,71	8.550,00				616,00	12,32%	1.053,36	616,00	12,32%	1.053,36	4.384,00	87,68%	7.496,64
15	FORROS				889.050,00				0,00		0,00	0,00		0,00			
15.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	2.500,00	105,51	263.775,00				154,00	6,16%	16.248,54	154,00	6,16%	16.248,54	2.346,00	93,84%	247.526,46
15.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	5.000,00	93,04	465.200,00				137,50	2,75%	12.793,00	137,50	2,75%	12.793,00	4.862,50	97,25%	452.407,00
15.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	2.500,00	64,03	160.075,00				475,00	19,00%	30.414,25	475,00	19,00%	30.414,25	2.025,00	81,00%	129.660,75
16	CERCAS E MUROS				386.662,50												
16.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	750,00	111,33	83.497,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	750,00	100,00%	83.497,50
16.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1.500,00	202,11	303.165,00				245,00	16,33%	49.516,95	245,00	16,33%	49.516,95	1.255,00	83,67%	253.648,05
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				305.355,68												
17.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	30,00	2.808,76	84.262,80				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	30,00	100,00%	84.262,80
17.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	25,00	277,34	6.933,50				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	25,00	100,00%	6.933,50
17.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	87,00	914,64	79.573,68				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	87,00	100,00%	79.573,68
17.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	300,00	322,88	96.864,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	100,00%	96.864,00



PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS

PROponente: Prefeitura Municipal de Imperatriz	JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Contrato Nº: 32/2026 - SINFRA	OBRa: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE IMPERATRIZ - MA.
MEDIDÃO Nº 1ª	LOCAL DAS OBRAS: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	DATA: 30/06/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIDÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
17.5	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 PE	UN	10,00	436,67	4.366,70				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	10,00	100,00%	4.366,70
17.6	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	500,00	23,65	11.825,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%	11.825,00
17.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	500,00	26,56	13.280,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	500,00	100,00%	13.280,00
17.8	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	m²	300,00	27,50	8.250,00				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	300,00	100,00%	8.250,00
18	LIMPEZA GERAL				83.085,00												
18.1	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF. 04/2019	m²	4.500,00	4,37	19.665,00				1.075,00	23,89%	4.697,75	1.075,00	23,89%	4.697,75	3.425,00	76,11%	14.967,25
18.2	Limpeza geral	m²	21.000,00	3,02	63.420,00				5.100,00	24,29%	15.402,00	5.100,00	24,29%	15.402,00	15.900,00	75,71%	48.018,00
TOTAL DA PLANILHA R\$					21.154.693,440000		0,00%	0,00		15,83%	3.348.452,74		15,83%	3.348.452,74		84,17%	17.806.240,70

IMPORTA A PRESENTE: MEDIDÃO Nº 1ª, O VALOR GLOBAL DE R\$ 3.348.452,74 (três milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

JUCELY ALVES FILHO
FISCAL SUBSTITUTO
MATRÍCULA: 85.584-7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 01 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.



Foto 02 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	



Foto 03 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.



Foto 04 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRÁ.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	



Foto 05 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.



Foto 06 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINTRA.		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.		VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).		ACUMULADO ATUAL:	R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01		SALDO ATUAL DO CONTRATO:	R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026		EXECUTADO %:	15,83%



Foto 07 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.



Foto 08 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINTRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 09 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.



Foto 10 | Quadra e guarita Esc. Frei Manoel Procópio.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 11 | Estacionamento da Prefeitura.



Foto 12 | Estacionamento da Prefeitura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFR.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 13 | Estacionamento da Prefeitura.



Foto 14 | Estacionamento da Prefeitura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFR.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	
	
Foto 15	Estacionamento da Prefeitura.
	
Fotos 16 e 17	Estacionamento da Prefeitura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFR.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	



Foto 18

Quiosque e Praça da Viola



Foto 19

Quiosque e Praça da Viola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44

CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74

LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74

MEDIÇÃO Nº: 01

SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70

EXECUTADO %: 15,83%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026



Foto 20

Quiosque e Praça da Viola



Foto 21

Quiosque e Praça da Viola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 22 | Quiosque e Praça da Viola



Foto 23 | Quiosque e Praça da Viola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERIODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	



Foto 24 | Quiosque e Praça da Viola



Foto 25 | Quiosque e Praça da Viola

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	



Foto 26 | UBS da Antiga Escola Dorgival



Foto 27 | UBS da Antiga Escola Dorgival

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 28 | UBS da Antiga Escola Dorgival

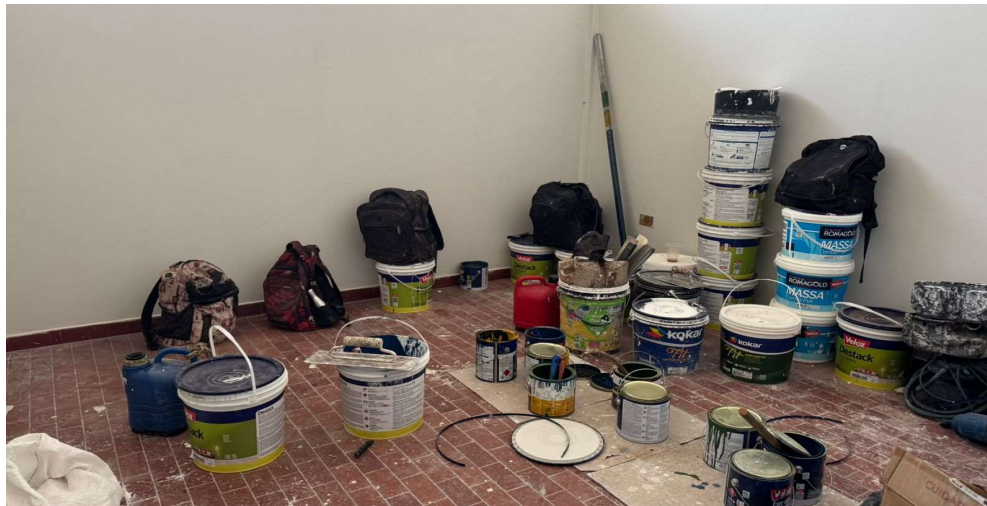


Foto 29 | UBS da Antiga Escola Dorgival

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Foto 30	UBS da Antiga Escola Dorgival
	
Foto 31	UBS da Antiga Escola Dorgival

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 32 | UBS da Antiga Escola Dorgival



Foto 33 | UBS da Antiga Escola Dorgival

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	
	
Foto 34	UBS da Antiga Escola Dorgival
	
Foto 35	Anexo quadra Praça Mané Garrincha.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 36 | Anexo quadra Praça Mané Garrincha.



Foto 37 | Anexo quadra Praça Mané Garrincha.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Foto 38 | Anexo quadra Praça Mané Garrincha.


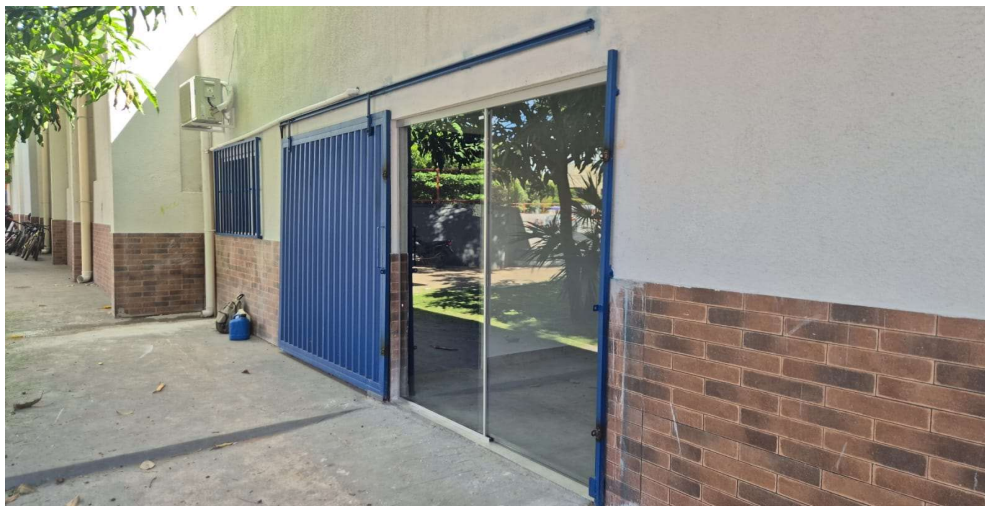


Foto 39 | Anexo quadra Praça Mané Garrincha.

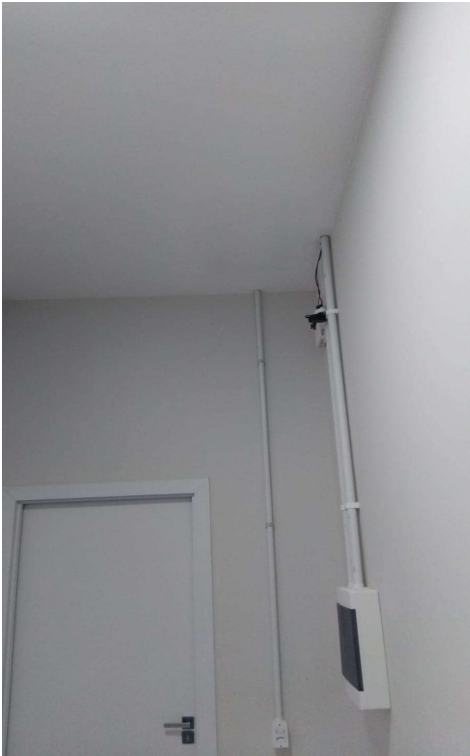

PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Fotos 40 e 41	Anexo quadra Praça Mané Garrincha.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Fotos 42 43	Anexo quadra Praça Mané Garrincha.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINPRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Fotos 44 e 45	Anexo quadra Praça Mané Garrincha.


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	

Fotos 46 e 47

Anexo quadra Praça Mané Garrincha.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

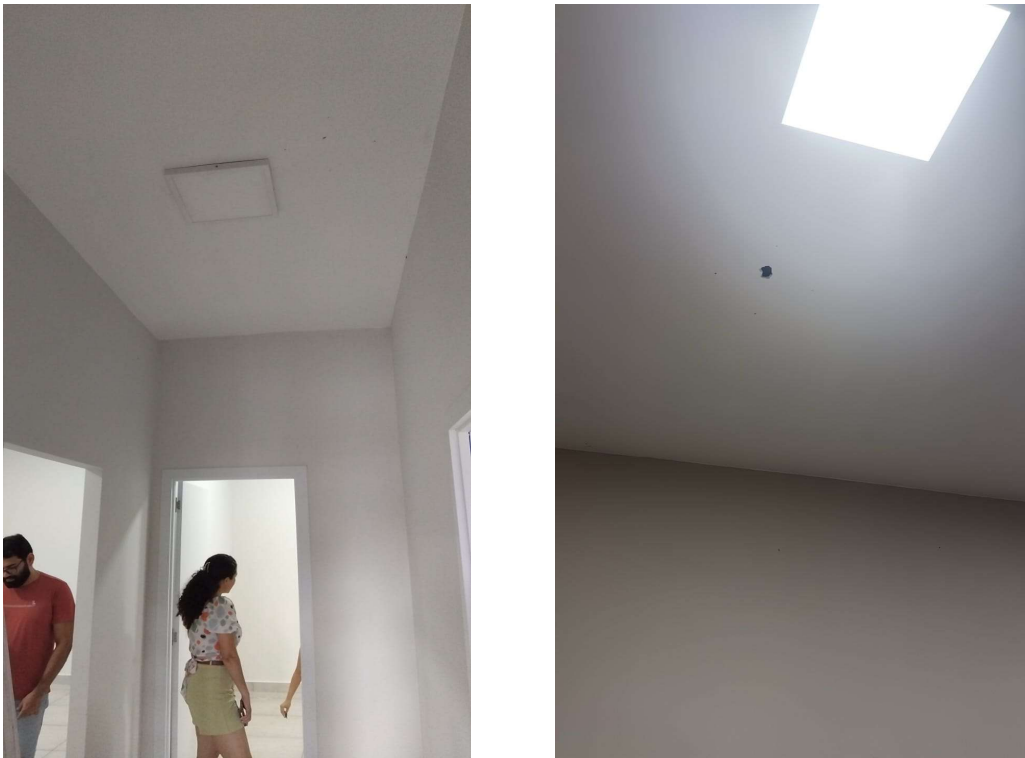
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRÁ.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERIODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	
	
Fotos 48 e 49	Anexo quadra Praça Mané Garrincha.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRÁ.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Fotos 50, 51 e 52

Reforma no Hospital Municipal Socorrão.

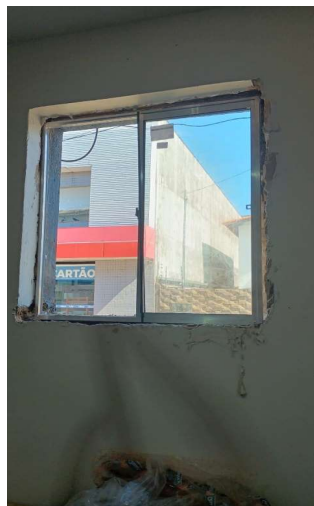

Fotos 53, 54 e 55

Reforma no Hospital Municipal Socorrão.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44

CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74

LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).

ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74

MEDIÇÃO Nº: 01

SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70

EXECUTADO %: 15,83%

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026



Fotos 56 e 57

Reforma da UBS da Lagoa Verde



Fotos 58 e 59


Reforma da UBS da Lagoa Verde

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Fotos 60 e 61	Reforma da UBS da Lagoa Verde
	
Fotos 62 e 63	Reforma da UBS da Lagoa Verde

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%
	
Fotos 64 e 65 Reforma da UBS da Lagoa Verde	
	
Fotos 66 e 67 Reforma da UBS da Lagoa Verde	



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

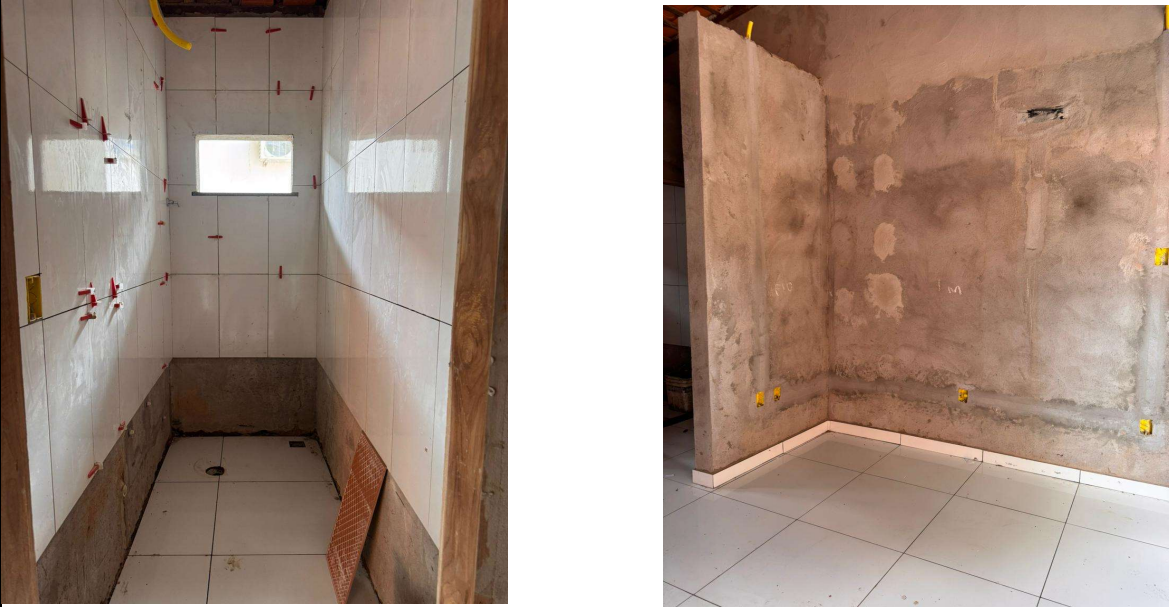RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
	EXECUTADO %: 15,83%
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	
	
Fotos 68 e 69 Reforma da UBS da Lagoa Verde	
	
Fotos 70 e 71 Reforma da UBS da Lagoa Verde	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%



Fotos 72 e 73 | Reforma da UBS da Lagoa Verde



Fotos 74 e 75 | Reforma da UBS da Lagoa Verde



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
DESCRIÇÃO DA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA, CORRETIVA, DE REPARAÇÃO/ADEQUAÇÃO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA.	VALOR DO CONTRATO: R\$ 21.154.693,44
CONSTRUTORA: JR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.	VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 3.348.452,74
LOCAL DA OBRA: QUADRA E GUARITA DA ESCOLA FREI MANOEL PROCÓPIO (O.S. 028/2026), UBS DA LAGOA VERDE (O.S. 035/2026), PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA (O.S. 039/2026), CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VIOLA (O.S. 040/2026), UBS DA ANTIGA ESCOLA DORGIVAL (O.S. 043/2026), ANEXO QUADRA PRAÇA MANÉ GARRINCHA (O.S. 046/2026), CPL (O.S. 047/2026) REFORMA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (SOCORRÃO) (O.S. 049/2026).	ACUMULADO ATUAL: R\$ 3.348.452,74
MEDIÇÃO Nº: 01	SALDO ATUAL DO CONTRATO: R\$ 17.806.240,70
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 03/06/2026 A 30/06/2026	EXECUTADO %: 15,83%

JUCELY ALVES FILHO
FISCAL SUBSTITUTO
MATRÍCULA: 85.584-7

DATA 10/07/2026
