



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III
 CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
 MEDIÇÃO Nº 07 ORDEM DE SERVIÇO: 016 / 2026
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Reciclagem do pavimento e execução de tratamento superficial duplo - TSD		1,00		R\$ 10.193.903,78			5.494.601,59			1.159.716,70			6.654.318,29			3.539.585,48
1.1	Reciclagem com adição de brita comercial e/ou cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	28.333,80	42,8600	R\$ 1.214.386,66	17.000,28	60,00%	728.632,00	5.646,76	19,93%	242.020,13	22.647,04	79,93%	970.652,13	5.686,76	20,07%	243.734,53
1.2	Brita 1	m3	7.083,45	172.3200	R\$ 1.220.620,10	4.250,07	60,00%	732.372,06	1.500,69	21,19%	258.598,90	5.750,76	81,19%	990.970,96	1.332,69	18,81%	229.649,14
1.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido	t	10.625,17	3,0900	R\$ 32.831,77	6.185,00	58,21%	19.111,65			-	6.185,00	58,21%	19.111,65	4.440,17	41,79%	13.720,12
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	1.179.394,41	0,9600	R\$ 1.132.218,63	707.636,646	60,00%	679.331,18	230.878,882	19,58%	221.643,73	938.515,53	79,58%	900.974,91	240.878,88	20,42%	231.243,72
1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	42.500,69	1,2000	R\$ 51.000,82	25.500,41	60,00%	30.600,49	8.508,138	20,02%	10.209,77	34.008,55	80,02%	40.810,26	8.492,14	19,98%	10.190,57
1.6	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kq	1.805.388,79	0,7400	R\$ 1.335.987,70	1.083.233,274	60,00%	801.592,62	360.877,758	19,99%	267.049,54	1.444.111,03	79,99%	1.068.642,16	361.277,76	20,01%	267.345,54
1.7	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	1.870,00	24,0600	R\$ 44.992,20	1.122,00	60,00%	26.995,32	344,00	18,40%	8.276,64	1.466,00	78,40%	35.271,96	404,00	21,60%	9.720,24
1.8	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	1.067.787,58	0,7900	R\$ 843.552,18	640.672,55	60,00%	506.131,31	191.557,516	17,94%	151.330,44	832.230,06	77,94%	657.461,75	235.557,52	22,06%	186.090,43
1.9	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	123.190,43	0,5200	R\$ 64.059,02	49.068,00	39,83%	25.515,36			-	49.068,00	39,83%	25.515,36	74.122,43	60,17%	38.543,66
1.10	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	123.190,43	6,4200	R\$ 790.882,56	49.068,00	39,83%	315.016,56			-	49.068,00	39,83%	315.016,56	74.122,43	60,17%	475.866,00
1.11	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	t	4.126,88	9,3600	R\$ 38.627,59	4.126,88	100,00%	38.627,60			-	4.126,88	100,00%	38.627,60	0,00	0,00%	-
1.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	458.083,63	0,9600	R\$ 439.760,28	340.175,00	74,26%	326.568,00			-	340.175,00	74,26%	326.568,00	117.908,63	25,74%	113.192,28
1.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	16.507,51	1,2000	R\$ 19.809,01	9.277,50	56,20%	11.133,00			-	9.277,50	56,20%	11.133,00	7.230,01	43,80%	8.676,01
1.14	Emulsão EAI	t	160,13	2.784,3800	R\$ 445.862,76	94,00	58,70%	261.731,72			-	94,00	58,70%	261.731,72	66,13	41,30%	184.131,04
1.15	Emulsão RR-2C	t	459,50	4.121,3400	R\$ 1.893.755,73	220,81	48,05%	910.033,09			-	220,81	48,05%	910.033,09	238,69	51,95%	983.722,64
1.16	Transporte Comercial (GOIÂNIA X CANTEIRO) (EAI)	t	160,13	537,3400	R\$ 86.044,25	94,00	58,70%	50.509,96			-	94,00	58,70%	50.509,96	66,13	41,30%	35.534,29
1.17	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-2C)	t	459,50	104,4400	R\$ 47.990,18	220,81	48,05%	23.061,40			-	220,81	48,05%	23.061,40	238,69	51,95%	24.928,78
1.18	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	619,64	114,3100	R\$ 70.831,04			-			-	0,00	0,00%	-	619,64	100,00%	70.831,04
1.19	Mobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49	0,58	92,00%	6.756,93	0,025	4,00%	293,78	0,60	96,00%	7.050,71	0,03	4,00%	293,77
1.20	Desmobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49	0,08	12,00%	881,34	0,025	4,00%	293,78	0,10	16,00%	1.175,12	0,53	84,00%	6.169,36
1.21	Administração	mês	2,50	162.400,9300	R\$ 406.002,32			-			-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	406.002,32
2	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO 8 MM				R\$ 3.740.797,31			1.122.239,19			769.998,93			1.892.238,12			1.848.559,12
2.1	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	283.338,00	2,4600	R\$ 697.011,48	85.001,40	30,00%	209.103,44	57.667,60	20,35%	141.862,30	142.669,00	50,35%	350.965,74	140.669,00	49,65%	346.045,74
2.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (usinagem - brita 0 e pó de pedra)	t	3.400,05	2,1500	R\$ 7.310,11	1.020,02	30,00%	2.193,03	580,01	17,06%	1.247,02	1.600,03	47,06%	3.440,05	1.800,03	52,94%	3.870,05
2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	377.406,21	0,9600	R\$ 362.309,96	113.221,86	30,00%	108.692,99	77.481,2425	20,53%	74.381,99	190.703,11	50,53%	183.074,98	186.703,11	49,47%	179.234,98
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	13.600,21	1,2000	R\$ 16.320,26	4.080,06	30,00%	4.896,08	2.920,0425	21,47%	3.504,05	7.000,11	51,47%	8.400,13	6.600,11	48,53%	7.920,12

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
 Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
 Fiscal do contrato
 Matrícula - 85.335-5



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 07 - CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III
 CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA
 MEDIÇÃO Nº 07 ORDEM DE SERVIÇO: 016 / 2026
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.5	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	3.400,05	11.4400	R\$ 38.896,57	1.020,02	30,00%	11.668,97	580,01	17,06%	6.635,31	1.600,03	47,06%	18.304,29	1.800,03	52,94%	20.592,28
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem) (metade extensão)	tkm	85.632,45	0,9600	R\$ 82.207,15	25.689,74	30,00%	24.662,15	17.926,49	20,93%	17.209,43	43.616,23	50,93%	41.871,58	42.016,23	49,07%	40.335,57
2.7	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	51,00	34,4800	R\$ 1.758,48	15,30	30,00%	527,54	8,20	16,08%	282,74	23,50	46,08%	810,28	27,50	53,92%	948,20
2.8	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica X Canteiro x Obra)	tkm	29.121,48	1,0000	R\$ 29.121,48	8.736,44	30,00%	8.736,44	5.624,295	19,31%	5.624,30	14.360,74	49,31%	14.360,74	14.760,74	50,69%	14.760,73
2.9	Emulsão RC-1C-E	t	507,18	4.383,5800	R\$ 2.223.242,19	152,15	30,00%	666.972,66	108,435	21,38%	475.333,50	260,59	51,38%	1.142.306,15	246,59	48,62%	1.080.936,03
2.10	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	507,18	104,4400	R\$ 52.969,36	152,15	30,00%	15.890,81	108,435	21,38%	11.324,95	260,59	51,38%	27.215,76	246,59	48,62%	25.753,59
2.11	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	507,18	114,3100	R\$ 57.975,17	152,15	30,00%	17.392,55	108,435	21,38%	12.395,20	260,59	51,38%	29.787,76	246,59	48,62%	28.187,41
2.12	Mobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	0,188	30,00%	1.510,79	0,1	16,00%	805,76	0,29	46,00%	2.316,55	0,34	54,00%	2.719,42
2.13	Desmobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	0,188	30,00%	1.510,79	-	-	0,19	30,00%	1.510,79	0,44	70,00%	3.525,17	
2.14	Administração	mês	1,25	129.282,5300	R\$ 161.603,16	0,38	30,00%	48.480,95	0,15	12,00%	19.392,38	0,53	42,00%	67.873,33	0,73	58,00%	93.729,83
3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ				R\$ 2.256.470,26			1.959.764,22					1.959.764,22			296.705,96	
3.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	59,0600	R\$ 22.311,39	253,75	67,17%	14.986,48	-	-	253,75	67,17%	14.986,48	124,03	32,83%	7.324,91	
3.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	77,7800	R\$ 29.383,34	153,75	40,70%	11.958,68	-	-	153,75	40,70%	11.958,68	224,03	59,30%	17.424,66	
3.3	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	3,5400	R\$ 3.209,63	609,00	67,17%	2.155,86	-	-	609,00	67,17%	2.155,86	297,68	32,83%	1.053,76	
3.4	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	5,3500	R\$ 4.850,71	3,69	0,41%	19,74	-	-	3,69	0,41%	19,74	902,99	99,59%	4.830,96	
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	1.813,36	0,9600	R\$ 1.740,83	1.173,60	64,72%	1.126,66	-	-	1.173,60	64,72%	1.126,66	639,76	35,28%	614,17	
3.6	Pintura de lição	m2	25.185,60	0,3600	R\$ 9.066,82	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	25.185,60	100,00%	9.066,81	
3.7	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	1.813,36	12,3000	R\$ 22.304,36	1.690,92	93,25%	20.798,32	-	-	1.690,92	93,25%	20.798,32	122,44	6,75%	1.506,04	
3.8	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	1.813,36	972,1100	R\$ 1.762.787,82	1.690,92	93,25%	1.643.760,24	-	-	1.690,92	93,25%	1.643.760,24	122,44	6,75%	119.027,57	
3.9	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	1.813,36	9,5100	R\$ 17.245,08	1.690,92	93,25%	16.080,65	-	-	1.690,92	93,25%	16.080,65	122,44	6,75%	1.164,42	
3.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa comercial) (Canteiro x Obra)	tkm	157.762,59	0,9600	R\$ 151.452,08	135.273,60	85,75%	129.862,66	-	-	135.273,60	85,75%	129.862,66	22.488,99	14,25%	21.589,42	
3.11	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	11,32	2.926,4000	R\$ 33.126,85	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	33.126,85	
3.12	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	11,32	104,4400	R\$ 1.182,26	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	1.182,26	
3.13	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	11,32	114,3100	R\$ 1.293,99	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	1.293,98	
3.14	Mobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	0,50	80,00%	3.774,73	-	-	0,50	80,00%	3.774,73	0,13	20,00%	943,68	
3.15	Desmobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,63	100,00%	4.718,41	
3.16	Administração	mês	1,25	149.662,6200	R\$ 187.078,28	0,77	61,60%	115.240,22	-	-	0,77	61,60%	115.240,22	0,48	38,40%	71.838,06	
4	Sinalização				R\$ 9.630,00			-					-			9.630,00	
4.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.500,00	1,3200	R\$ 1.980,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.500,00	100,00%	1.980,00	
4.2	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	9.000,00	0,8500	R\$ 7.650,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	9.000,00	100,00%	7.650,00	
TOTAL DA PLANILHA R\$					R\$ 16.200.801,34		52,94%	R\$ 8.576.604,99		11,91%	R\$ 1.929.715,63		64,85%	R\$ 10.506.320,62		35,15%	R\$ 5.694.480,69



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA BETA - BACURI




RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI

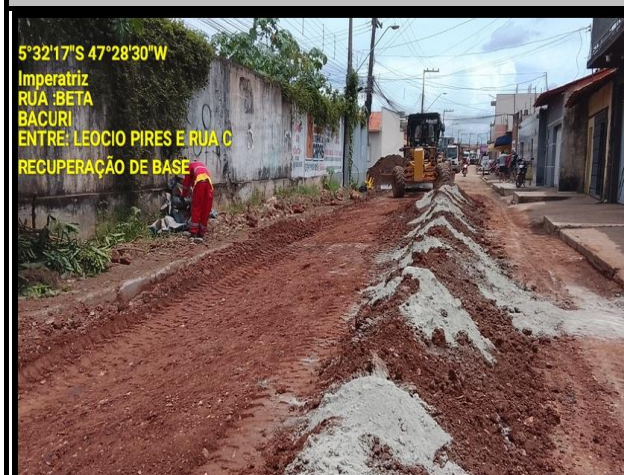

RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA


CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

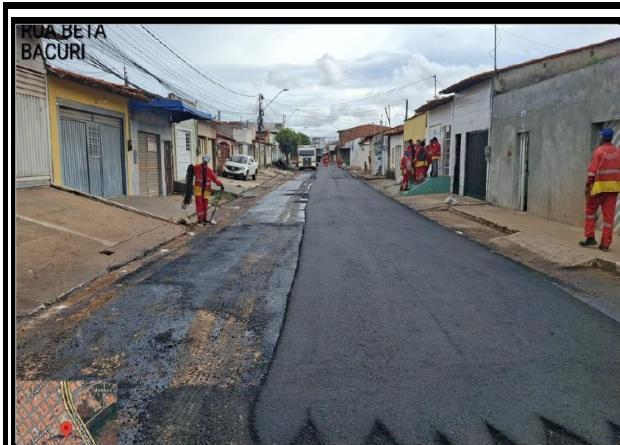

RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI

5°32'17,508"S 47°28'29,958"W
R. Beta, 398 - Bacuri, Imperatriz - MA, 65916-100, Brasil
RECAPEAMENTO: RUA BETA



RUA BETA - BACURI

5°32'17,436"S 47°28'30,024"W
R. Beta, 398 - Bacuri, Imperatriz - MA, 65916-100, Brasil
RECAPEAMENTO: RUA BETA



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



RUA BETA - BACURI



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 07:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

ORDEM DE SERVIÇO N.º 016/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

