



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 2º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Lote 01 - Execução de Recuperação, Conservação e Manutenção de Vias Urbanas do Município de Imperatriz - MA				23.434.234,39			2.511.875,84			2.941.569,39			5.453.445,23			17.980.789,17
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				495.444,35			175.700,18			44.954,28			220.654,46			274.789,89
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				495.444,35			175.700,18			44.954,28			220.654,46			274.789,89
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,30	1.616.502,36	484.950,71	0,10	34,07%	165.206,54	0,03	9,27%	44.954,28	0,13	43,34%	210.160,82	0,17	56,66%	274.789,89
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	m²	18,00	582,98	10.493,64	18,00	100,00%	10.493,64	0,00	0,00%	-	18,00	100,00%	10.493,64	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				94.532,42			16.070,51			11.031,31			27.101,82			67.430,60
1.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	0,00	0,00%	-	0,14	14,06%	6.645,37	0,14	14,06%	6.645,37	0,86	85,94%	40.620,84
1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	0,34	34,00%	16.070,51	0,09	9,28%	4.385,94	0,43	43,28%	20.456,45	0,57	56,72%	26.809,76
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				388.865,40			1.324,73			54.486,10			55.810,83			333.054,57
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	30,00	12.962,18	388.865,40	0,10	0,34%	1.324,73	4,20	14,01%	54.486,10	4,31	14,35%	55.810,83	25,69	85,65%	333.054,57
1.4	FRESAGEM				255.731,32			-			35.954,43			35.954,43			219.776,89
1.4.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.820,00	69,80	127.036,00	0,00	0,00%	-	255,88	14,06%	17.860,57	255,88	14,06%	17.860,57	1.564,12	85,94%	109.175,43
1.4.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	260,00	90,63	23.563,80	0,00	0,00%	-	36,55	14,06%	3.312,94	36,55	14,06%	3.312,94	223,45	85,94%	20.250,86
1.4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	129.792,00	0,81	105.131,52	0,00	0,00%	-	18.248,05	14,06%	14.780,92	18.248,05	14,06%	14.780,92	111.543,95	85,94%	90.350,60
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				1.566.161,48			182.084,20			194.593,71			376.677,91			1.189.483,57
1.5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	109.200,00	0,70	76.440,00	27.720,00	25,38%	19.404,00	11.455,64	10,49%	8.018,95	39.175,64	35,88%	27.422,95	70.024,36	64,12%	49.017,05
1.5.2	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	5.460,00	15,09	82.391,40	1.996,13	36,56%	30.121,53	487,00	8,92%	7.348,86	2.483,13	45,48%	37.470,39	2.976,87	54,52%	44.921,01
1.5.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	21.840,00	9,41	205.514,40	0,00	0,00%	-	3.070,58	14,06%	28.894,20	3.070,58	14,06%	28.894,20	18.769,42	85,94%	176.620,20
1.5.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	56.784,00	3,37	191.362,08	4.790,70	8,44%	16.144,66	7.309,97	12,87%	24.634,61	12.100,67	21,31%	40.779,27	44.683,33	78,69%	150.582,81
1.5.5	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	851.760,00	0,81	689.925,60	143.721,00	16,87%	116.414,01	99.546,42	11,69%	80.632,60	243.267,42	28,56%	197.046,61	608.492,58	71,44%	492.878,99
1.5.6	Resulização de base-fora com espalhamento e compactação	m³	27.300,00	4,84	132.132,00	0,00	0,00%	-	3.838,23	14,06%	18.577,04	3.838,23	14,06%	18.577,04	23.461,77	85,94%	113.554,96
1.5.7	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, C/ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	5.200,00	36,23	188.396,00	0,00	0,00%	-	731,09	14,06%	26.487,45	731,09	14,06%	26.487,45	4.468,91	85,94%	161.908,55
1.6	PAVIMENTAÇÃO				11.455.442,40			2.136.696,22			1.310.164,87			3.446.861,09			8.008.581,32
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				428.444,02			102.585,00			45.814,00			148.399,00			280.045,02
1.6.1.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	4.368,00	1,82	7.949,76	1.500,00	34,34%	2.730,00	403,23	9,23%	733,87	1.903,23	43,57%	3.463,87	2.464,77	56,43%	4.485,89
1.6.1.2	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	4.368,00	0,08	349,44	0,00	0,00%	-	614,13	14,06%	49,13	614,13	14,06%	49,13	3.753,88	85,94%	300,31
1.6.1.3	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	4.368,00	19,27	84.171,36	1.500,00	34,34%	28.905,00	403,23	9,23%	7.770,15	1.903,23	43,57%	36.675,15	2.464,77	56,43%	47.496,21
1.6.1.4	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	6.552,00	1,82	11.924,64	1.500,00	22,89%	2.730,00	710,29	10,84%	1.292,72	2.210,29	33,73%	4.022,72	4.341,71	66,27%	7.191,92
1.6.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	6.552,00	7,23	47.370,96	1.500,00	22,89%	10.845,00	710,28	10,84%	5.135,35	2.210,28	33,73%	15.980,35	4.341,72	66,27%	31.390,61
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
1.6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	271.252,80	1,02	276.677,86	56.250,00	20,74%	57.375,00	30.228,22	11,14%	30.832,78	86.478,22	31,88%	88.207,78	184.774,58	68,12%	188.470,08
1.6.2	"RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)"				1.204.489,98			404.578,31			112.463,22			517.041,53			687.448,45
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	52,42	7.665,35	401.786,98	15,75	30,05%	120.729,26	5,16	9,83%	39.515,18	20,91	39,88%	160.244,44	31,51	60,12%	241.542,54
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	21,84	4.370,96	95.461,77	9,38	42,93%	40.977,75	1,75	8,02%	7.660,16	11,13	50,95%	48.637,91	10,71	49,05%	46.823,86
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	131,04	5.397,14	707.241,23	45,00	34,34%	242.871,30	12,10	9,23%	65.287,88	57,13	43,57%	308.159,18	73,94	56,43%	399.082,05
1.6.3	IMPRIMAÇÃO CM-30				22.713,60			3.900,00			2.645,09			6.545,09			16.168,51
1.6.3.1	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	43.680,00	0,52	22.713,60	7.500,00	17,17%	3.900,00	5.086,71	11,65%	2.645,09	12.586,71	28,82%	6.545,09	31.093,29	71,18%	16.168,51
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C				15.288,00			2.625,00			1.780,35			4.405,35			10.882,65
1.6.4.1	Pintura de ligação	m²	43.680,00	0,35	15.288,00	7.500,00	17,17%	2.625,00	5.086,71	11,65%	1.780,35	12.586,71	28,82%	4.405,35	31.093,29	71,18%	10.882,65
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E= 5 CM)				1.945.944,00			334.125,00			226.612,95			560.737,95			1.385.206,05
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	2.184,00	891,00	1.945.944,00	375,00	17,17%	334.125,00	254,34	11,65%	226.612,95	629,34	28,82%	560.737,95	1.554,66	71,18%	1.385.206,05
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				110.388,10			21.870,00			12.445,16			34.315,16			76.072,94
1.6.6.1	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	136.281,60	0,81	110.388,10	27.000,00	19,81%	21.870,00	15.364,40	11,27%	12.445,16	42.364,40	31,09%	34.315,16	93.917,20	68,91%	76.072,94



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 2º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO)				1.092.119,79			816.278,96			38.781,72			855.060,68			237.059,11
1.6.7.1	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	273,00	367,35	100.286,55	272,80	99,93%	100.213,08	0,03	0,01%	10,33	272,83	99,94%	100.223,41	0,17	0,06%	63,14
1.6.7.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.828,00	1,02	10.024,56	8.184,00	83,27%	8.347,68	231,14	2,35%	235,76	8.415,14	85,62%	8.583,44	1.412,86	14,38%	1.441,12
1.6.7.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	273,00	4,84	1.321,32	0,00	0,00%	-	38,38	14,06%	185,77	38,38	14,06%	185,77	234,62	85,94%	1.135,55
1.6.7.4	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	1.310,40	32,85	43.046,64	818,40	62,45%	26.884,44	69,17	5,28%	2.272,32	887,57	67,73%	29.156,76	422,83	32,27%	13.889,88
1.6.7.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.070,40	1,02	34.751,81	24.552,00	72,06%	25.043,04	1.338,24	3,93%	1.365,00	25.890,24	75,99%	26.408,04	8.180,16	24,01%	8.343,77
1.6.7.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais- Usinagem	t	1.310,40	208,05	272.628,72	872,18	66,56%	181.457,05	61,61	4,70%	12.818,24	933,79	71,26%	194.275,29	376,61	28,74%	78.353,43
1.6.7.7	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	5,46	4.370,96	23.865,44	5,46	100,00%	23.865,44	0,00	0,00%	-	5,46	100,00%	23.865,44	0,00	0,00%	-
1.6.7.8	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	65,52	5.397,14	353.620,61	43,61	66,56%	235.363,88	3,08	4,70%	16.626,25	46,69	71,26%	251.990,13	18,83	28,74%	101.630,48
1.6.7.9	Tapa buraco com mistura de ligação - demolição manual	m³	546,00	462,59	252.574,14	465,00	85,16%	215.104,35	11,39	2,09%	5.268,05	476,39	87,25%	220.372,40	69,61	12,75%	32.201,74
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO e MICROREVESTIMENTO)				4.384.688,39			460.733,95			563.092,53			1.003.826,48			3.380.861,91
1.6.8.1	Remoção manual de camada granular do pavimento	m²	2.457,00	236,03	579.925,71	270,00	10,99%	63.728,10	307,48	12,51%	72.574,57	577,48	23,50%	136.302,67	1.879,52	76,50%	443.623,04
1.6.8.2	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	819,00	367,35	300.859,65	270,00	32,97%	99.184,50	77,19	9,42%	28.354,43	347,19	42,39%	127.538,93	471,81	57,61%	173.320,72
1.6.8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	117.936,00	1,02	120.294,72	19.440,00	16,48%	19.828,80	13.848,00	11,74%	14.124,96	33.288,00	28,23%	33.953,76	84.648,00	71,77%	86.340,96
1.6.8.4	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	3.276,00	4,84	15.855,84	270,00	8,24%	1.306,80	422,63	12,90%	2.045,52	692,63	21,14%	3.352,32	2.583,37	78,86%	12.503,52
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	-	0,00	0,00%	-	
1.6.8.6	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3.40 m³ e descarga livre	t	9.828,00	3,37	33.120,36	0,00	0,00%	-	1.381,76	14,06%	4.656,54	1.381,76	14,06%	4.656,54	8.446,24	85,94%	28.463,82
1.6.8.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	147.420,00	0,81	119.410,20	0,00	0,00%	-	20.726,44	14,06%	16.788,42	20.726,44	14,06%	16.788,42	126.693,56	85,94%	102.621,78
1.6.8.8	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	3.931,20	208,05	817.886,16	648,00	16,48%	134.816,40	461,60	11,74%	96.035,88	1.109,60	28,23%	230.852,28	2.821,60	71,77%	587.033,88
1.6.8.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	16,38	4.370,96	71.596,32	13,50	82,42%	59.007,96	0,40	2,47%	1.769,85	13,90	84,89%	60.777,81	2,48	15,11%	10.818,51
1.6.8.10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	196,56	5.397,14	1.060.861,84	13,50	6,87%	72.861,39	25,74	13,09%	138.907,47	39,24	19,96%	211.768,86	157,32	80,04%	849.092,98
1.6.8.11	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	3.931,20	32,85	129.139,92	0,00	0,00%	-	552,71	14,06%	18.156,37	552,71	14,06%	18.156,37	3.378,49	85,94%	110.983,55
1.6.8.12	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	8.353,80	3,57	29.823,07	0,00	0,00%	-	1.174,50	14,06%	4.192,96	1.174,50	14,06%	4.192,96	7.179,30	85,94%	25.630,11
1.6.8.13	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	319.410,00	1,02	325.798,20	0,00	0,00%	-	44.907,30	14,06%	45.805,45	44.907,30	14,06%	45.805,45	274.502,70	85,94%	279.992,75
1.6.8.14	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m²	1.008,00	454,55	458.186,40	0,00	0,00%	-	141,72	14,06%	64.418,51	141,72	14,06%	64.418,51	866,28	85,94%	393.767,89
1.6.8.15	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	63.000,00	5,11	321.930,00	0,00	0,00%	-	8.857,46	14,06%	45.261,60	8.857,46	14,06%	45.261,60	54.142,54	85,94%	276.668,40
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE				2.251.366,53			-			316.529,85			316.529,85			1.934.836,68
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM VIA ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	5.460,00	41,42	226.153,20	0,00	0,00%	-	767,65	14,06%	31.795,91	767,65	14,06%	31.795,91	4.692,35	85,94%	194.357,29
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM.	m²	13.104,00	142,39	1.865.878,56	0,00	0,00%	-	1.842,35	14,06%	262.332,34	1.842,35	14,06%	262.332,34	11.261,65	85,94%	1.603.546,22
1.6.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.838,60	0,95	3.646,67	0,00	0,00%	-	539,68	14,06%	512,70	539,68	14,06%	512,70	3.298,92	85,94%	3.133,97
1.6.9.4	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural	tkm	65.415,17	2,38	155.688,10	0,00	0,00%	-	9.197,02	14,06%	21.888,90	9.197,02	14,06%	21.888,90	56.218,15	85,94%	133.799,20
1.7	DRENAGEM URBANA				9.178.057,02			-			1.290.384,69			1.290.384,69			7.887.672,33
1.7.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	5.000,00	74,83	374.150,00	0,00	0,00%	-	702,97	14,06%	52.603,45	702,97	14,06%	52.603,45	4.297,03	85,94%	321.546,55
1.7.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	5.000,00	84,49	422.450,00	0,00	0,00%	-	702,97	14,06%	59.394,16	702,97	14,06%	59.394,16	4.297,03	85,94%	363.055,84
1.7.3	Ciação manual com fixador de cal	m²	15.600,00	3,94	61.464,00	0,00	0,00%	-	2.193,27	14,06%	8.641,50	2.193,27	14,06%	8.641,50	13.406,73	85,94%	52.822,50
1.7.4	Limpeza de buéiro	m³	300,00	26,47	7.941,00	0,00	0,00%	-	42,18	14,06%	1.116,46	42,18	14,06%	1.116,46	257,82	85,94%	6.824,54
1.7.5	Limpeza de ponte	m	200,00	5,29	1.058,00	0,00	0,00%	-	28,12	14,06%	148,75	28,12	14,06%	148,75	171,88	85,94%	909,25
1.7.6	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	45.350,00	0,88	39.908,00	0,00	0,00%	-	6.375,97	14,06%	5.610,85	6.375,97	14,06%	5.610,85	38.974,03	85,94%	34.297,15
1.7.7	Limpeza de vala de drenagem	m	9.070,00	5,29	47.980,30	0,00	0,00%	-	1.275,19	14,06%	6.745,77	1.275,19	14,06%	6.745,77	7.794,81	85,94%	41.234,53



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 2º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 A 30/04/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.7.8	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	1.000,00	77,38	77.380,00	0,00	0,00%	-	140,59	14,06%	10.879,21	140,59	14,06%	10.879,21	859,41	85,94%	66.500,79
1.7.9	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	500,00	25,52	12.760,00	0,00	0,00%	-	70,30	14,06%	1.793,99	70,30	14,06%	1.793,99	429,70	85,94%	10.966,01
1.7.10	Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada	tkm	45.000,00	1,31	58.950,00	0,00	0,00%	-	6.326,76	14,06%	8.288,05	6.326,76	14,06%	8.288,05	38.673,24	85,94%	50.661,95
1.7.11	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	50,00	26,47	1.323,50	0,00	0,00%	-	7,03	14,06%	186,08	7,03	14,06%	186,08	42,97	85,94%	1.137,42
1.7.12	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	100,00	12,45	1.245,00	0,00	0,00%	-	14,06	14,06%	175,04	14,06	14,06%	175,04	85,94	85,94%	1.069,96
1.7.13	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	100,00	13,81	1.381,00	0,00	0,00%	-	14,06	14,06%	194,16	14,06	14,06%	194,16	85,94	85,94%	1.186,84
1.7.14	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	16,00	1.253,58	20.057,28	0,00	0,00%	-	2,25	14,06%	2.819,94	2,25	14,06%	2.819,94	13,75	85,94%	17.237,34
1.7.15	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	un	10,00	2.952,18	29.521,80	0,00	0,00%	-	1,41	14,06%	4.150,60	1,41	14,06%	4.150,60	8,59	85,94%	25.371,20
1.7.16	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	363,92	72.784,00	0,00	0,00%	-	28,12	14,06%	10.233,03	28,12	14,06%	10.233,03	171,88	85,94%	62.550,97
1.7.17	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	1.117,62	223.524,00	0,00	0,00%	-	28,12	14,06%	31.426,25	28,12	14,06%	31.426,25	171,88	85,94%	192.097,75
1.7.18	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	2.386,71	477.342,00	0,00	0,00%	-	28,12	14,06%	67.111,68	28,12	14,06%	67.111,68	171,88	85,94%	410.230,32
1.7.19	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	2.038,49	2.038.490,00	0,00	0,00%	-	140,59	14,06%	286.600,57	140,59	14,06%	286.600,57	859,41	85,94%	1.751.889,43
1.7.20	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	774,19	774.190,00	0,00	0,00%	-	140,59	14,06%	108.846,89	140,59	14,06%	108.846,89	859,41	85,94%	665.343,11
1.7.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	26.286,00	1,55	40.743,30	0,00	0,00%	0,00	3.695,67	14,06%	5.728,29	3.695,67	14,06%	5.728,29	22.590,33	85,94%	35.015,01
1.7.22	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	150,00	7.459,10	1.118.865,00	0,00	0,00%	-	21,09	14,06%	157.306,31	21,09	14,06%	157.306,31	128,91	85,94%	961.558,69
1.7.23	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	12,00	3.777,50	45.330,00	0,00	0,00%	-	1,69	14,06%	6.373,15	1,69	14,06%	6.373,15	10,31	85,94%	38.956,85
1.7.24	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	9.881,26	98.812,60	0,00	0,00%	-	1,41	14,06%	13.892,51	1,41	14,06%	13.892,51	8,59	85,94%	84.920,09
1.7.25	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	4,00	44.136,08	176.544,32	0,00	0,00%	-	0,56	14,06%	24.821,17	0,56	14,06%	24.821,17	3,44	85,94%	151.723,15
1.7.26	Popo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais	un	16,00	4.235,63	67.770,08	0,00	0,00%	-	2,25	14,06%	9.528,10	2,25	14,06%	9.528,10	13,75	85,94%	58.241,98
1.7.27	Popo de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais	un	10,00	6.395,06	63.950,60	0,00	0,00%	-	1,41	14,06%	8.991,11	1,41	14,06%	8.991,11	8,59	85,94%	54.959,49
1.7.28	Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno	m³	50,00	990,78	49.539,00	0,00	0,00%	-	7,03	14,06%	6.964,91	7,03	14,06%	6.964,91	42,97	85,94%	42.574,09
1.7.29	Demolição manual de concreto simples	m³	50,00	491,89	24.594,50	0,00	0,00%	-	7,03	14,06%	3.457,85	7,03	14,06%	3.457,85	42,97	85,94%	21.136,65
1.7.30	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	550,00	109,47	60.208,50	0,00	0,00%	-	77,33	14,06%	8.464,99	77,33	14,06%	8.464,99	472,67	85,94%	51.743,51
1.7.31	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.000,00	15,10	105.700,00	0,00	0,00%	-	984,16	14,06%	14.860,84	984,16	14,06%	14.860,84	6.015,84	85,94%	90.839,16
1.7.32	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	599,24	29.962,00	0,00	0,00%	-	7,03	14,06%	4.212,49	7,03	14,06%	4.212,49	42,97	85,94%	25.749,51
1.7.33	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	748,61	37.430,50	0,00	0,00%	-	7,03	14,06%	5.262,52	7,03	14,06%	5.262,52	42,97	85,94%	32.167,98
1.7.34	Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	m	2.500,00	86,04	215.100,00	0,00	0,00%	-	351,49	14,06%	30.241,89	351,49	14,06%	30.241,89	2.148,51	85,94%	184.858,11
1.7.35	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	17.404,90	8,48	147.593,55	0,00	0,00%	-	2.447,03	14,06%	20.750,85	2.447,03	14,06%	20.750,85	14.957,87	85,94%	126.842,70
1.7.36	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	12.727,79	20,82	264.992,59	0,00	0,00%	-	1.789,46	14,06%	37.256,51	1.789,46	14,06%	37.256,51	10.938,33	85,94%	227.736,08
1.7.37	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.000,00	255,74	255.740,00	0,00	0,00%	-	140,59	14,06%	35.955,65	140,59	14,06%	35.955,65	859,41	85,94%	219.784,35
1.7.38	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m²	280,00	203,87	57.083,60	0,00	0,00%	-	39,37	14,06%	8.025,64	39,37	14,06%	8.025,64	240,63	85,94%	49.057,96
1.7.39	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	140,00	51,55	7.217,00	0,00	0,00%	-	19,68	14,06%	1.014,67	19,68	14,06%	1.014,67	120,32	85,94%	6.202,33
1.7.40	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	609.700,00	0,95	579.215,00	0,00	0,00%	-	85.720,49	14,06%	81.434,47	85.720,49	14,06%	81.434,47	523.979,51	85,94%	497.780,53
1.7.41	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação	m	300,00	3.292,55	987.765,00	0,00	0,00%	-	42,18	14,06%	138.874,34	42,18	14,06%	138.874,34	257,82	85,94%	848.890,66
TOTAL DA PLANILHA R\$					23.434.234,39		10,72%	2.511.875,84		12,55%	2.941.569,39		23,27%	5.453.445,23		76,73%	17.980.789,16



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



AV. JK - 01/04/2026



AV. JK - 01/04/2026



RUA 14 - 06/04/2026



RUA 14 - 06/04/2026



RUA 14 - 07/04/2026



RUA 14 - 07/04/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA 11 - 08/04/2026



RUA 11 - 08/04/2026



RUA 11 - 10/04/2026



RUA 11 - 10/04/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 10/04/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 10/04/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 14/04/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 14/04/2026



RUA SÃO JOSE - 14/04/2026



RUA SÃO JOSE - 14/04/2026



RUA SÃO JOSE - 15/04/2026



RUA SÃO JOSE - 15/04/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40

MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA 1 DE MAIO - 15/04/2026



RUA 1 DE MAIO - 15/04/2026



RUA SÃO JOSE - 16/04/2026



RUA SÃO JOSE - 16/04/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 16/04/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 16/03/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)


MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 17/04/2026

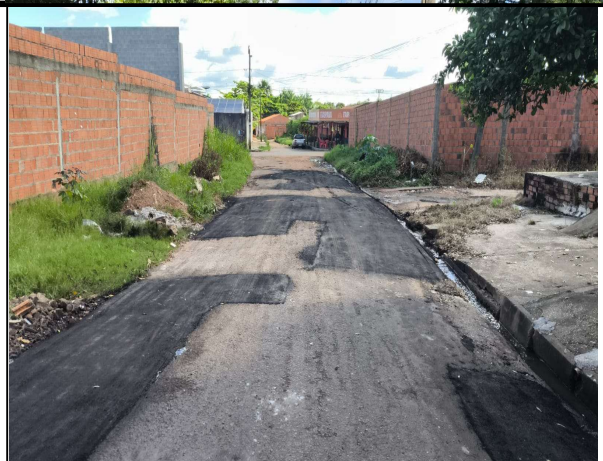

RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 17/04/2026




RUA GONÇALVES DIAS - 18/04/2026



RUA GONÇALVES DIAS - 18/04/2026



RUA SÃO JOSE - 27/04/2026

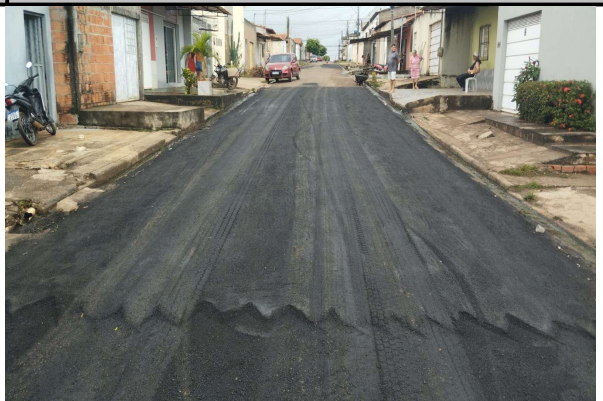

RUA SÃO JOSE - 27/04/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 02:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2026 a 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA SÃO JOSE - 29/04/2026



RUA SÃO JOSE - 29/04/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7
