



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de reaparelamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 1º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026 - ORDEM DE SERVIÇO 008/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Lote 01 - Execução de Recuperação, Conservação e Manutenção de Vias Urbanas do Município de Imperatriz - MA				23.434.234,39												20.922.358,53
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				495.444,35												319.744,17
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				495.444,35												319.744,17
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,30	1.616.502,36	484.950,71	-			0,10	34,07%	165.206,54	0,10	34,07%	165.206,54	0,20	65,93%	319.744,17
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	18,00	582,98	10.493,64	-			18,00	100,00%	10.493,64	18,00	100,00%	10.493,64	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				94.532,42												78.461,90
1.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	-			0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	1,00	100,00%	47.266,21
1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	-			0,34	34,00%	16.070,51	0,34	34,00%	16.070,51	0,66	66,00%	31.195,69
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				388.865,40												387.540,67
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	30,00	12.962,18	388.865,40	-			0,10	0,34%	1.324,73	0,10	0,34%	1.324,73	29,90	99,66%	387.540,67
1.4	FRESAGEM				255.731,32												255.731,32
1.4.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	1.820,00	69,80	127.036,00	-						0,00	0,00%	-	1.820,00	100,00%	127.036,00
1.4.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	260,00	90,63	23.563,80	-						0,00	0,00%	-	260,00	100,00%	23.563,80
1.4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	129.792,00	0,81	105.131,52	-						0,00	0,00%	-	129.792,00	100,00%	105.131,52
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				1.566.161,48												1.384.077,28
1.5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	109.200,00	0,70	76.440,00	-			27.720,00	25,38%	19.404,00	27.720,00	25,38%	19.404,00	81.480,00	74,62%	57.036,00
1.5.2	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	5.460,00	15,09	82.391,40	-			1.996,13	36,56%	30.121,53	1.996,13	36,56%	30.121,53	3.463,88	63,44%	52.269,87
1.5.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	21.840,00	9,41	205.514,40	-						0,00	0,00%	-	21.840,00	100,00%	205.514,40
1.5.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	56.784,00	3,37	191.362,08	-			4.790,70	8,44%	16.144,66	4.790,70	8,44%	16.144,66	51.993,30	91,56%	175.217,42
1.5.5	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	851.760,00	0,81	689.925,60	-			143.721,00	16,87%	116.414,01	143.721,00	16,87%	116.414,01	708.039,00	83,13%	573.511,59
1.5.6	Regularização de base fora com espalhamento e compactação	m³	27.300,00	4,84	132.132,00	-						0,00	0,00%	-	27.300,00	100,00%	132.132,00
1.5.7	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, C/ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	5.200,00	36,23	188.396,00	-						0,00	0,00%	-	5.200,00	100,00%	188.396,00
1.6	PAVIMENTAÇÃO				11.455.442,40												9.318.746,17
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				428.444,02												325.859,02
1.6.1.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	4.368,00	1,82	7.949,76	-			1.500,00	34,34%	2.730,00	1.500,00	34,34%	2.730,00	2.868,00	65,66%	5.219,76
1.6.1.2	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	4.368,00	0,08	349,44	-						0,00	0,00%	-	4.368,00	100,00%	349,44
1.6.1.3	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	4.368,00	19,27	84.171,36	-			1.500,00	34,34%	28.905,00	1.500,00	34,34%	28.905,00	2.868,00	65,66%	55.266,36
1.6.1.4	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	6.552,00	1,82	11.924,64	-			1.500,00	22,89%	2.730,00	1.500,00	22,89%	2.730,00	5.052,00	77,11%	9.194,64
1.6.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	6.552,00	7,23	47.370,96	-			1.500,00	22,89%	10.845,00	1.500,00	22,89%	10.845,00	5.052,00	77,11%	36.525,96
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTIPO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-	-						0,00	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	-
1.6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	271.252,80	1,02	276.677,86	-			56.250,00	20,74%	57.375,00	56.250,00	20,74%	57.375,00	215.002,80	79,26%	219.302,86
1.6.2	"RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)"				1.204.489,98												799.911,67
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	52,42	7.665,35	401.786,98	-			15,75	30,05%	120.729,26	15,75	30,05%	120.729,26	36,67	69,95%	281.057,72
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	21,84	4.370,96	95.461,77	-			9,38	42,93%	40.977,75	9,38	42,93%	40.977,75	12,47	57,07%	54.484,02
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	131,04	5.397,14	707.241,23	-			45,00	34,34%	242.871,30	45,00	34,34%	242.871,30	86,04	65,66%	464.369,93
1.6.3	IMPRIMAÇÃO CM-30				22.713,60												18.813,60
1.6.3.1	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	43.680,00	0,52	22.713,60	-			7.500,00	17,17%	3.900,00	7.500,00	17,17%	3.900,00	36.180,00	82,83%	18.813,60
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C				15.288,00												12.663,00
1.6.4.1	Pintura de ligação	m²	43.680,00	0,35	15.288,00	-			7.500,00	17,17%	2.625,00	7.500,00	17,17%	2.625,00	36.180,00	82,83%	12.663,00
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E= 5 CM)				1.945.944,00												1.611.819,00
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	2.184,00	891,00	1.945.944,00	-			375,00	17,17%	334.125,00	375,00	17,17%	334.125,00	1.809,00	82,83%	1.611.819,00
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				110.388,10												88.518,10
1.6.6.1	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	136.281,60	0,81	110.388,10	-			27.000,00	19,81%	21.870,00	27.000,00	19,81%	21.870,00	109.281,60	80,19%	88.518,10



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de reaparelamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 1º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026 - ORDEM DE SERVIÇO 008/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPABURACO)				1.092.119,79												275.840,83
1.6.7.1	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	273,00	367,35	100.286,55			-	272,80	99,93%	100.213,08	272,80	99,93%	100.213,08	0,20	0,07%	73,46
1.6.7.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.828,00	1,02	10.024,56			-	8.184,00	83,27%	8.347,68	8.184,00	83,27%	8.347,68	1.644,00	16,73%	1.676,88
1.6.7.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	273,00	4,84	1.321,32			-			-	0,00	0,00%	-	273,00	100,00%	1.321,32
1.6.7.4	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	1.310,40	32,85	43.046,64			-	818,40	62,45%	26.884,44	818,40	62,45%	26.884,44	492,00	37,55%	16.162,20
1.6.7.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.070,40	1,02	34.751,81			-	24.552,00	72,06%	25.043,04	24.552,00	72,06%	25.043,04	9.518,40	27,94%	9.708,77
1.6.7.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais- Usinagem	t	1.310,40	208,05	272.628,72			-	872,18	66,56%	181.457,05	872,18	66,56%	181.457,05	438,22	33,44%	91.171,67
1.6.7.7	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	5,46	4.370,96	23.865,44			-	5,46	100,00%	23.865,44	5,46	100,00%	23.865,44	0,00	0,00%	-
1.6.7.8	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	65,52	5.397,14	353.620,61			-	43,61	66,56%	235.363,88	43,61	66,56%	235.363,88	21,91	33,44%	118.256,74
1.6.7.9	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m³	546,00	462,59	252.574,14			-	465,00	85,16%	215.104,35	465,00	85,16%	215.104,35	81,00	14,84%	37.469,79
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO e MICROREVESTIMENTO)				4.384.688,39												3.933.954,44
1.6.8.1	Remoção manual de camada granular do pavimento	m²	2.457,00	236,03	579.925,71			-	270,00	10,99%	63.728,10	270,00	10,99%	63.728,10	2.187,00	89,01%	516.197,61
1.6.8.2	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	819,00	367,35	300.859,65			-	270,00	32,97%	99.184,50	270,00	32,97%	99.184,50	549,00	67,03%	201.675,15
1.6.8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	117.936,00	1,02	120.294,72			-	19.440,00	16,48%	19.828,80	19.440,00	16,48%	19.828,80	98.496,00	83,52%	100.465,92
1.6.8.4	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	3.276,00	4,84	15.855,84			-	270,00	8,24%	1.306,80	270,00	8,24%	1.306,80	3.006,00	91,76%	14.549,04
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTCO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-			-			-	0,00	#DIV/0!	-	0,00	#DIV/0!	-
1.6.8.6	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3.40 m³ e descarga livre	t	9.828,00	3,37	33.120,36			-			-	0,00	0,00%	-	9.828,00	100,00%	33.120,36
1.6.8.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	147.420,00	0,81	119.410,20			-			-	0,00	0,00%	-	147.420,00	100,00%	119.410,20
1.6.8.8	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	3.931,20	208,05	817.886,16			-	648,00	16,48%	134.816,40	648,00	16,48%	134.816,40	3.283,20	83,52%	683.069,76
1.6.8.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	16,38	4.370,96	71.596,32			-	13,50	82,42%	59.007,96	13,50	82,42%	59.007,96	2,88	17,58%	12.588,36
1.6.8.10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	196,56	5.397,14	1.060.861,84			-	13,50	6,87%	72.861,39	13,50	6,87%	72.861,39	183,06	93,13%	988.000,45
1.6.8.11	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	3.931,20	32,85	129.139,92			-			-	0,00	0,00%	-	3.931,20	100,00%	129.139,92
1.6.8.12	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	8.353,80	3,57	29.823,07			-			-	0,00	0,00%	-	8.353,80	100,00%	29.823,07
1.6.8.13	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	319.410,00	1,02	325.798,20			-			-	0,00	0,00%	-	319.410,00	100,00%	325.798,20
1.6.8.14	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m²	1.008,00	454,55	458.186,40			-			-	0,00	0,00%	-	1.008,00	100,00%	458.186,40
1.6.8.15	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	63.000,00	5,11	321.930,00			-			-		0,00%	-	63.000,00	100,00%	321.930,00
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE				2.251.366,53												2.251.366,53
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM VIA ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	5.460,00	41,42	226.153,20			-			-	0,00	0,00%	-	5.460,00	100,00%	226.153,20
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM.	m²	13.104,00	142,39	1.865.878,56			-			-	0,00	0,00%	-	13.104,00	100,00%	1.865.878,56
1.6.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.838,60	0,95	3.646,67			-			-	0,00	0,00%	-	3.838,60	100,00%	3.646,67
1.6.9.4	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural	tkm	65.415,17	2,38	155.688,10			-			-	0,00	0,00%	-	65.415,17	100,00%	155.688,10
1.7	DRENAGEM URBANA				9.178.057,02												9.178.057,02
1.7.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	5.000,00	74,83	374.150,00			-			-	0,00	0,00%	-	5.000,00	100,00%	374.150,00
1.7.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	5.000,00	84,49	422.450,00			-			-	0,00	0,00%	-	5.000,00	100,00%	422.450,00
1.7.3	Caixação manual com fixador de cal	m²	15.600,00	3,94	61.464,00			-			-	0,00	0,00%	-	15.600,00	100,00%	61.464,00
1.7.4	Limpeza de bueiro	m³	300,00	26,47	7.941,00			-			-	0,00	0,00%	-	300,00	100,00%	7.941,00
1.7.5	Limpeza de ponte	m	200,00	5,29	1.058,00			-			-	0,00	0,00%	-	200,00	100,00%	1.058,00
1.7.6	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	45.350,00	0,88	39.908,00			-			-	0,00	0,00%	-	45.350,00	100,00%	39.908,00
1.7.7	Limpeza de vala de drenagem	m	9.070,00	5,29	47.980,30			-			-	0,00	0,00%	-	9.070,00	100,00%	47.980,30



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE IMPERATRIZ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 1º

DATA: 28/01/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 05/03/2026 A 31/03/2026 - ORDEM DE SERVIÇO 008/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.7.8	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	1.000,00	77,38	77.380,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.000,00	100,00%	77.380,00
1.7.9	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	500,00	25,52	12.760,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	500,00	100,00%	12.760,00
1.7.10	Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada	tkm	45.000,00	1,31	58.950,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	45.000,00	100,00%	58.950,00
1.7.11	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	50,00	26,47	1.323,50	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	50,00	100,00%	1.323,50
1.7.12	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	100,00	12,45	1.245,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	1.245,00
1.7.13	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	100,00	13,81	1.381,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	100,00	100,00%	1.381,00
1.7.14	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	16,00	1.253,58	20.057,28	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	16,00	100,00%	20.057,28
1.7.15	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	un	10,00	2.952,18	29.521,80	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	29.521,80
1.7.16	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	363,92	72.784,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	200,00	100,00%	72.784,00
1.7.17	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	1.117,62	223.524,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	200,00	100,00%	223.524,00
1.7.18	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	2.386,71	477.342,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	200,00	100,00%	477.342,00
1.7.19	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	2.038,49	2.038.490,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.000,00	100,00%	2.038.490,00
1.7.20	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	774,19	774.190,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.000,00	100,00%	774.190,00
1.7.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada	tkm	26.286,00	1,55	40.743,30	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	26.286,00	100,00%	40.743,30
1.7.22	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	150,00	7.459,10	1.118.865,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	150,00	100,00%	1.118.865,00
1.7.23	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	12,00	3.777,50	45.330,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	12,00	100,00%	45.330,00
1.7.24	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	9.881,26	98.812,60	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	98.812,60
1.7.25	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	4,00	44.136,08	176.544,32	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	4,00	100,00%	176.544,32
1.7.26	Popo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais	un	16,00	4.235,63	67.770,08	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	16,00	100,00%	67.770,08
1.7.27	Popo de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais	un	10,00	6.395,06	63.950,60	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	10,00	100,00%	63.950,60
1.7.28	Demolição de concreto armado com marteleto e corte oxiacetileno	m³	50,00	990,78	49.539,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	50,00	100,00%	49.539,00
1.7.29	Demolição manual de concreto simples	m³	50,00	491,89	24.594,50	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	50,00	100,00%	24.594,50
1.7.30	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	550,00	109,47	60.208,50	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	550,00	100,00%	60.208,50
1.7.31	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.000,00	15,10	105.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	7.000,00	100,00%	105.700,00
1.7.32	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	599,24	29.962,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	50,00	100,00%	29.962,00
1.7.33	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	748,61	37.430,50	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	50,00	100,00%	37.430,50
1.7.34	Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	m	2.500,00	86,04	215.100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	2.500,00	100,00%	215.100,00
1.7.35	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	17.404,90	8,48	147.593,55	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	17.404,90	100,00%	147.593,55
1.7.36	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	12.727,79	20,82	264.992,59	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	12.727,79	100,00%	264.992,59
1.7.37	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.000,00	255,74	255.740,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.000,00	100,00%	255.740,00
1.7.38	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	280,00	203,87	57.083,60	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	280,00	100,00%	57.083,60
1.7.39	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	140,00	51,55	7.217,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	140,00	100,00%	7.217,00
1.7.40	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	609.700,00	0,95	579.215,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	609.700,00	100,00%	579.215,00
1.7.41	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação	m	300,00	3.292,55	987.765,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	300,00	100,00%	987.765,00
TOTAL DA PLANILHA R\$					23.434.234,39		0,00%	-		10,72%	2.511.875,84		10,72%	2.511.875,84		89,28%	20.922.358,53



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA:** NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40

**MEDIÇÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**RUA PARAIBA - 16/03/2026**



**RUA RIO GRANDE DO NORTE - 16/03/2026**



**RUA MINAS GERAIS - 16/03/2026**



**RUA HERMES DE FONSECA - 16/03/2026**



**RUA FREI. EP. D'BADIA - 17/03/2026**



**RUA FREI EP. D'BADIA - 17/03/2026**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA:** NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40

**MEDIÇÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/03/2026 a 31/03/2026


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**




**RUA SÃO FRANCISCO - 18/03/2026**



**RUA SÃO FRANCISCO - 18/03/2026**

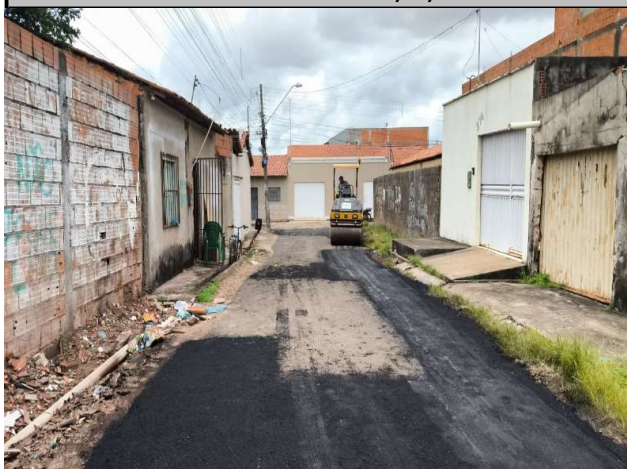

**RUA FREI EP. D'BADIA - 18/03/2026**

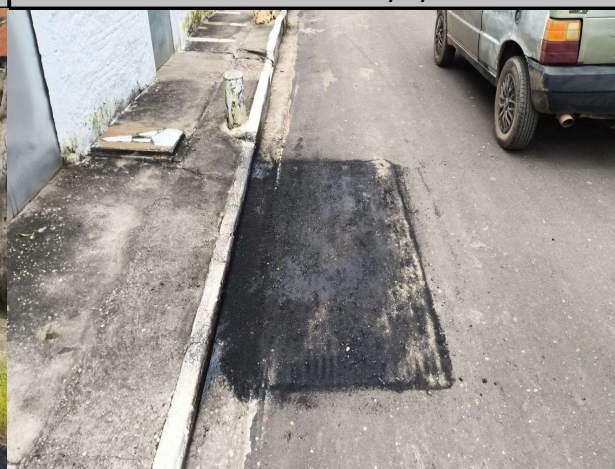

**RUA RAIMUNDO DE MORAIS - 18/03/2026**



**RUA SÃO FRANCISCO - 19/03/2026**



**RUA HERMES DA FONSECA - 19/03/2026**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA:** NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40

**MEDIÇÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**RUA SÃO FRANCISCO - 20/03/2026**



**RUA SÃO FRANCISCO - 20/03/2026**



**RUA HERMES DA FONSECA - 20/03/2026**



**RUA PARAIBA - 20/03/2026**



**RUA SÃO FRANCISCO - 23/03/2026**



**AV JK - 23/03/2026**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA:** NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40

**MEDIÇÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**RUA SÃO FRANCISCO - 24/03/2026**



**AV JK - 24/03/2026**



**RUA SÃO FRANCISCO - 25/03/2026**



**AV JK - 25/03/2026**



**RUA ITAUNA - 25/03/2026**



**RUA AGUANAMBI - 25/03/2026**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40**

**MEDIÇÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/03/2026 a 31/03/2026**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**AV INDUSTRIAL - 26/03/2026**



**AV JK - 26/03/2026**



**RUA AGUANAMBI - 26/03/2026**



**RUA AGUANAMBI - 26/03/2026**



**AV JK - 27/03/2026**



**AV JK - 27/03/2026**



**PODER EXECUTIVO**  
**MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**  
**SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS**

**CONTRATO: N.º 002/2026 – SINFRA**


**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

**CONTRATADA:** NEX EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ.: 50.559.650/0001-40

**MEDICÃO 01:**

**PERÍODO DE REFERÊNCIA:** 01/03/2026 a 31/03/2026

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

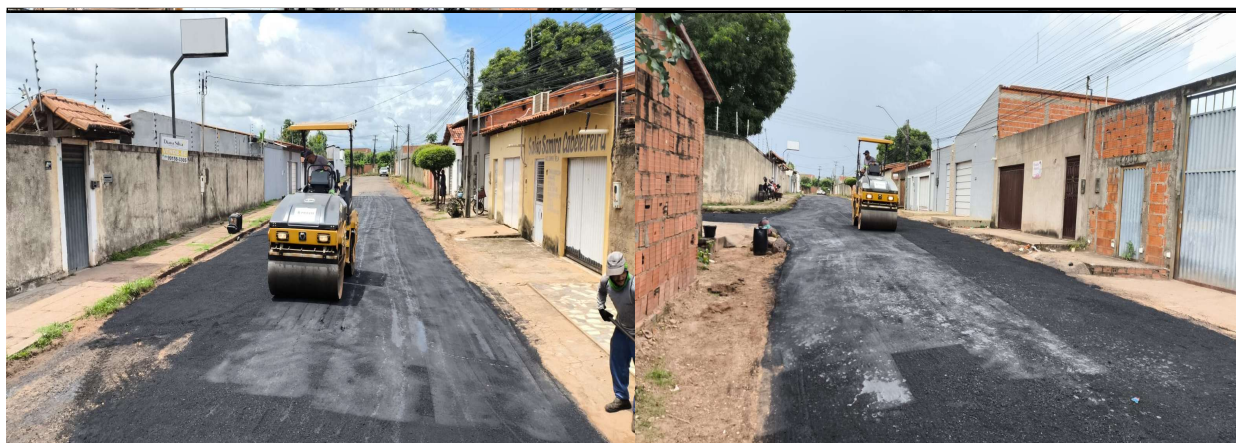

**RUA AGUANAMBI - 30/03/2026**

**RUA AGUANAMBI - 30/03/2026**
