



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 05 - CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

MEDIÇÃO Nº 05

ORDEM DE SERVIÇO: 014 / 2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Reciclagem do pavimento e execução de tratamento superficial duplo - TSD		1,00		R\$ 10.193.903,78						2.006.447,92			2.006.447,92			8.187.455,84
1.1	Reciclagem com adição de brita comercial e/ou cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base	m3	28.333,80	42,8600	R\$ 1.214.386,66						-	0,00	0,00%	-	28.333,80	100,00%	1.214.386,66
1.2	Brita 1	m3	7.083,45	172,3200	R\$ 1.220.620,10						-	0,00	0,00%	-	7.083,45	100,00%	1.220.620,10
1.3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido	t	10.625,17	3,0900	R\$ 32.831,77						-	6.185,00	58,21%	19.111,65	6.185,00	58,21%	13.720,12
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	1.179.394,41	0,9600	R\$ 1.132.218,63						-	0,00	0,00%	-	1.179.394,41	100,00%	1.132.218,63
1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	42.500,69	1,2000	R\$ 51.000,82						-	0,00	0,00%	-	42.500,69	100,00%	51.000,82
1.6	Cimento Portland CP II - 32 - a granel	kg	1.805.388,79	0,7400	R\$ 1.335.987,70						-	0,00	0,00%	-	1.805.388,79	100,00%	1.335.987,70
1.7	Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão silo de 30 m³	t	1.870,00	24,0600	R\$ 44.992,20						-	0,00	0,00%	-	1.870,00	100,00%	44.992,20
1.8	Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	1.067.787,58	0,7900	R\$ 843.552,18						-	0,00	0,00%	-	1.067.787,58	100,00%	843.552,18
1.9	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	123.190,43	0,5200	R\$ 64.059,02						-	49.068,00	39,83%	25.515,36	49.068,00	39,83%	38.543,66
1.10	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m2	123.190,43	6,4200	R\$ 790.882,56						-	49.068,00	39,83%	315.016,56	49.068,00	39,83%	475.866,00
1.11	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável	t	4.126,88	9,3600	R\$ 38.627,59						-	6.185,00	149,87%	57.891,60	6.185,00	149,87%	19.264,00
1.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	458.083,63	0,9600	R\$ 439.760,28						-	340.175,00	74,26%	326.568,00	340.175,00	74,26%	113.192,28
1.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (brita) (Pedreira x Obra)	tkm	16.507,51	1,2000	R\$ 19.809,01						-	9.277,50	56,20%	11.133,00	9.277,50	56,20%	8.676,01
1.14	Emulsão EAI	t	160,13	2.784,3800	R\$ 445.862,76						-	94,00	58,70%	261.731,72	94,00	58,70%	184.131,04
1.15	Emulsão RR-2C	t	459,50	4.121,3400	R\$ 1.893.755,73						-	220,81	48,05%	910.033,09	220,81	48,05%	983.722,64
1.16	Transporte Comercial (GOIÂNIA X CANTEIRO) (EAI)	t	160,13	537,3400	R\$ 86.044,25						-	94,00	58,70%	50.509,96	94,00	41,30%	35.534,29
1.17	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-2C)	t	459,50	104,4400	R\$ 47.990,18						-	220,81	48,05%	23.061,40	220,81	51,95%	24.928,78
1.18	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	619,64	114,3100	R\$ 70.831,04						-	0,00	0,00%	-	619,64	100,00%	70.831,04
1.19	Mobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49						-	0,500	80,00%	5.875,59	0,13	20,00%	1.468,89
1.20	Desmobilização	%	0,625	11.751,1800	R\$ 7.344,49						-	0,00	0,00%	-	0,63	100,00%	7.344,48
1.21	Administração	mês	2,50	162.400,9300	R\$ 406.002,32						-	0,00	0,00%	-	2,50	100,00%	406.002,32
2	MICROREVESTIMENTO ASFÁLTICO 8 MM				R\$ 3.740.797,31						-			-			3.740.797,24
2.1	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial	m2	283.338,00	2,4600	R\$ 697.011,48						-	0,00	0,00%	-	283.338,00	100,00%	697.011,48
2.2	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (usinagem - brita 0 e pó de pedra)	t	3.400,05	2,1500	R\$ 7.310,11						-	0,00	0,00%	-	3.400,05	100,00%	7.310,10
2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	377.406,21	0,9600	R\$ 362.309,96						-	0,00	0,00%	-	377.406,21	100,00%	362.309,96
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (usinagem - brita 0 e pó de pedra) (Pedreira x Obra)	tkm	13.600,21	1,2000	R\$ 16.320,26						-	0,00	0,00%	-	13.600,21	100,00%	16.320,25

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matricula - 85.335-5



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Imperatriz
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 05 - CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

CONTRATO Nº: 002/2025 - SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

MEDIÇÃO Nº 05

ORDEM DE SERVIÇO: 014 / 2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

Item	Descrição	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO			
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
2.5	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (usinagem)	t	3.400,05	11,4400	R\$ 38.896,57	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	3.400,05	100,00%	38.896,57
2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (usinagem) (metade extensão)	tkm	85.632,45	0,9600	R\$ 82.207,15	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	85.632,45	100,00%	82.207,15
2.7	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (filler)	t	51,00	34,4800	R\$ 1.758,48	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	51,00	100,00%	1.758,48
2.8	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (Fábrica x Canteiro x Obra)	tkm	29.121,48	1,0000	R\$ 29.121,48	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	29.121,48	100,00%	29.121,47
2.9	Emulsão RC-1C-E	t	507,18	4.383,5800	R\$ 2.223.242,19	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	507,18	100,00%	2.223.242,18
2.10	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RC-1C-E)	t	507,18	104,4400	R\$ 52.969,36	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	507,18	100,00%	52.969,35
2.11	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	507,18	114,3100	R\$ 57.975,17	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	507,18	100,00%	57.975,17
2.12	Mobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,63	100,00%	5.035,96
2.13	Desmobilização	%	0,625	8.057,5500	R\$ 5.035,97	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,63	100,00%	5.035,96
2.14	Administração	mês	1,25	129.282,5300	R\$ 161.603,16	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1,25	100,00%	161.603,16
3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CBUQ				R\$ 2.256.470,26							1.959.764,22			1.959.764,22		296.705,96
3.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	59,0600	R\$ 22.311,39	-	253,75	67,17%	14.986,48	253,75	67,17%	14.986,48	124,03	32,83%	7.324,91		
3.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico	m3	377,775	77,7800	R\$ 29.383,34	-	153,75	40,70%	11.958,68	153,75	40,70%	11.958,68	224,03	59,30%	17.424,66		
3.3	Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	3,5400	R\$ 3.209,63	-	609,00	67,17%	2.155,86	609,00	67,17%	2.155,86	297,68	32,83%	1.053,76		
3.4	Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre	t	906,68	5,3500	R\$ 4.850,71	-	3,69	0,41%	19,74	3,69	0,41%	19,74	902,99	99,59%	4.830,96		
3.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material fresado)	tkm	1.813,36	0,9600	R\$ 1.740,83	-	1.173,60	64,72%	1.126,66	1.173,60	64,72%	1.126,66	639,76	35,28%	614,17		
3.6	Pintura de ligação	m2	25.185,60	0,3600	R\$ 9.066,82	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	25.185,60	100,00%	9.066,81		
3.7	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	1.813,36	12,3000	R\$ 22.304,36	-	1.690,92	93,25%	20.798,32	1.690,92	93,25%	20.798,32	122,44	6,75%	1.506,04		
3.8	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t	1.813,36	972,1100	R\$ 1.762.787,82	-	1.690,92	93,25%	1.643.760,24	1.690,92	93,25%	1.643.760,24	122,44	6,75%	119.027,57		
3.9	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibrocabadora	t	1.813,36	9,5100	R\$ 17.245,08	-	1.690,92	93,25%	16.080,65	1.690,92	93,25%	16.080,65	122,44	6,75%	1.164,42		
3.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (massa comercial) (Canteiro x Obra)	tkm	157.762,59	0,9600	R\$ 151.452,08	-	135.273,60	85,75%	129.862,66	135.273,60	85,75%	129.862,66	22.488,99	14,25%	21.589,42		
3.11	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	11,32	2.926,4000	R\$ 33.126,85	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	33.126,85		
3.12	Transporte Comercial (PALMAS X CANTEIRO) (RR-1C)	t	11,32	104,4400	R\$ 1.182,26	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	1.182,26		
3.13	Transporte Local (CANTEIRO X SERVIÇO)	t	11,32	114,3100	R\$ 1.293,99	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	11,32	100,00%	1.293,98		
3.14	Mobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	-	0,50	80,00%	3.774,73	0,50	80,00%	3.774,73	0,13	20,00%	943,68		
3.15	Desmobilização	%	0,625	7.549,4600	R\$ 4.718,41	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	0,63	100,00%	4.718,41		
3.16	Administração	mês	1,25	149.662,6200	R\$ 187.078,28	-	0,77	61,60%	115.240,22	0,77	61,60%	115.240,22	0,48	38,40%	71.838,06		
4	Sinalização				R\$ 9.630,00												9.630,00
4.1	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m	un.dia	1.500,00	1,3200	R\$ 1.980,00	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	1.500,00	100,00%	1.980,00		
4.2	Cone plástico para canalização de trânsito	un.dia	9.000,00	0,8500	R\$ 7.650,00	-	-	-	-	0,00	0,00%	-	9.000,00	100,00%	7.650,00		
TOTAL DA PLANILHA R\$					R\$ 16.200.801,34		0,00%	R\$		24,48%	R\$ 3.966.212,14		24,48%	R\$ 3.966.212,14		75,52%	R\$ 12.234.589,17

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

VITOR LEAL DE SOUSA
Fiscal do contrato
Matricula - 85.335-5



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 05:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM DE SERVIÇO: 014/2026


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA GREGÓRIO DE MATOS - BACURI



RUA GREGÓRIO DE MATOS - BACURI

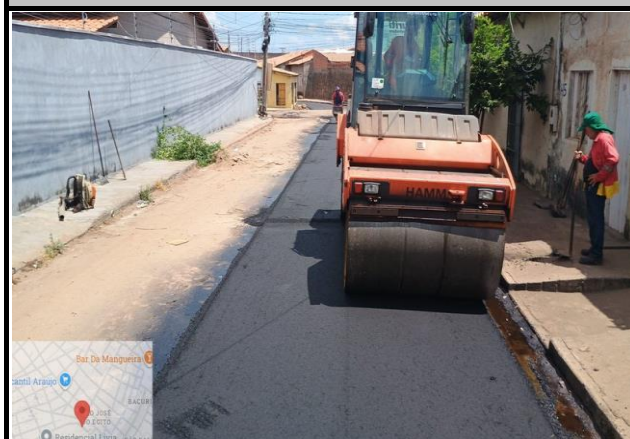

RUA GREGÓRIO DE MATOS - BACURI



RUA GREGÓRIO DE MATOS - BACURI



RUA EUCLIDES DA CUNHA - CENTRO



RUA EUCLIDES DA CUNHA - CENTRO



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 05:


PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM DE SERVIÇO: 014/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA EUCLIDES DA CUNHA - CENTRO

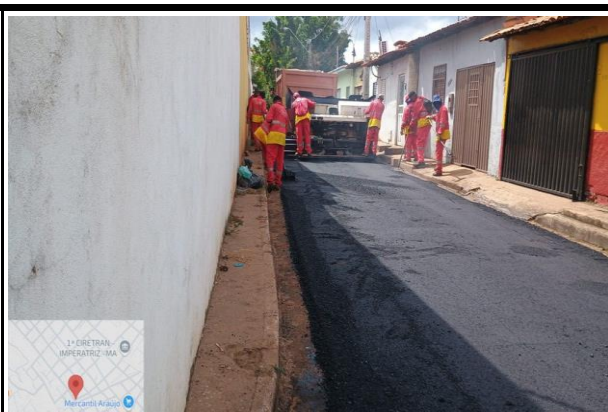

RUA EUCLIDES DA CUNHA - CENTRO




AVENIDA DA LIBERDADE - MORADA DO SOL



AVENIDA DA LIBERDADE - MORADA DO SOL



AVENIDA DA LIBERDADE - MORADA DO SOL

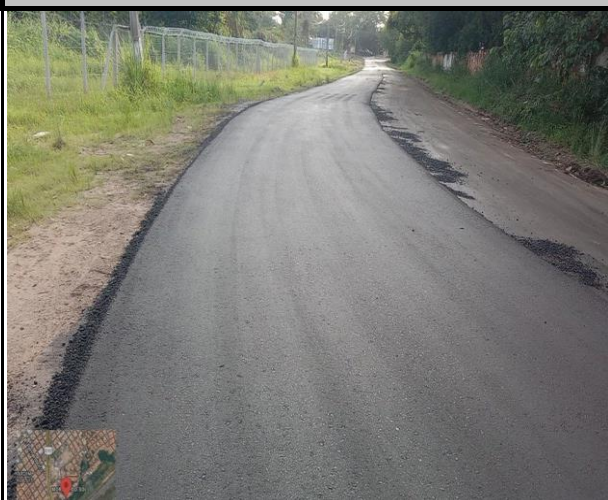

AVENIDA DA LIBERDADE - MORADA DO SOL



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 05:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM DE SERVIÇO: 014/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA TOM JOBIM - VILINHA



RUA TOM JOBIM - VILINHA



AVENIDA ARAGUAIA - VILINHA



AVENIDA ARAGUAIA VILINHA



AVENIDA ATLÂNTICA - VILINHA



AVENIDA ATLÂNTICA - VILINHA



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 05:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM DE SERVIÇO: 014/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



AVENIDA ATLÂNTICA - VILINHA



RUA ALAGOAS - CENTRO



RUA ALAGOAS - CENTRO



RUA ALAGOAS - CENTRO



RUA JOÃO LISBOA - VILA LOBÃO



RUA JOÃO LISBOA - VILA LOBÃO



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: n.º 002/2025 – SINFRA

OBJETO: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS JÁ EXISTENTES, POR MEIO DE RECAPEAMENTO OU REPAROS PONTUAIS, EM ATENDIMENTO À SINFRA

CONTRATADA: CONSÓRCIO CENTRO NORTE III

MEDIÇÃO N.º 05:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 13/03/2026 A 31/03/2026

ORDEM DE SERVIÇO: 014/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA JOÃO LISBOA - VILA LOBÃO



RUA JOÃO LISBOA - VILA LOBÃO
