



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 3ª

DATA: 29/05/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 A 31/05/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1	Lote 01 - Execução de Recuperação, Conservação e Manutenção de Vias Urbanas do Município de Imperatriz - MA				23.434.234,39			5.453.445,23			2.273.313,45			7.726.758,68			15.707.475,71
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				495.444,35			220.654,46			34.741,72			255.396,18			240.048,17
1.1.1	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS				495.444,35			220.654,46			34.741,72			255.396,18			240.048,17
1.1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,30	1.616.502,36	484.950,71	0,13	43,34%	210.160,82	0,02	7,16%	34.741,72	0,15	50,50%	244.902,54	0,15	49,50%	240.048,17
1.1.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS	m²	18,00	582,98	10.493,64	18,00	100,00%	10.493,64	0,00	0,00%	-	18,00	100,00%	10.493,64	0,00	0,00%	-
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				94.532,42			27.101,82			8.525,26			35.627,08			58.905,34
1.2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	0,14	14,06%	6.645,37	0,11	10,87%	5.135,70	0,25	24,92%	11.781,07	0,75	75,08%	35.485,14
1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	47.266,21	47.266,21	0,43	43,28%	20.456,45	0,07	7,17%	3.389,56	0,50	50,45%	23.846,01	0,50	49,55%	23.420,20
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				388.865,40			55.810,83			42.108,13			97.918,96			290.946,44
1.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	30,00	12.962,18	388.865,40	4,31	14,35%	55.810,83	3,25	10,83%	42.108,13	7,55	25,18%	97.918,96	22,45	74,82%	290.946,44
1.4	FRESAGEM				255.731,32			35.954,43			27.786,42			63.740,85			191.990,47
1.4.1	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m²	1.820,00	69,80	127.036,00	255,88	14,06%	17.860,57	197,75	10,87%	13.803,07	453,63	24,92%	31.663,64	1.366,37	75,08%	95.372,36
1.4.2	Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m²	260,00	90,63	23.563,80	36,55	14,06%	3.312,94	28,25	10,87%	2.560,32	64,80	24,92%	5.873,26	195,20	75,08%	17.690,54
1.4.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	129.792,00	0,81	105.131,52	18.248,05	14,06%	14.780,92	14.102,51	10,87%	11.423,03	32.350,56	24,92%	26.203,95	97.441,44	75,08%	78.927,57
1.5	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO				1.566.161,48			376.677,91			150.386,57			527.064,48			1.039.097,00
1.5.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	109.200,00	0,70	76.440,00	39.175,64	35,88%	27.422,95	8.853,19	8,11%	6.197,23	48.028,83	43,98%	33.620,18	61.171,17	56,02%	42.819,82
1.5.2	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	5.460,00	15,08	82.391,40	2.483,13	45,48%	37.470,39	376,37	6,89%	5.679,37	2.859,49	52,37%	43.149,76	2.800,51	47,63%	39.241,64
1.5.3	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m²	21.840,00	9,41	205.514,40	3.070,58	14,06%	28.894,20	2.373,02	10,87%	22.330,12	5.443,60	24,92%	51.224,32	16.396,40	75,08%	154.290,08
1.5.4	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	56.784,00	3,37	191.362,08	12.100,67	21,31%	40.779,27	5.649,32	9,95%	19.038,21	17.749,99	31,26%	59.817,48	39.034,01	68,74%	131.544,60
1.5.5	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	851.760,00	0,81	689.925,60	243.267,42	28,56%	197.046,61	76.931,79	9,03%	62.314,75	320.199,21	37,59%	259.361,36	531.560,79	62,41%	430.564,24
1.5.6	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	27.300,00	4,84	132.132,00	3.838,23	14,06%	18.577,04	2.966,27	10,87%	14.356,77	6.804,51	24,92%	32.933,81	20.495,49	75,08%	99.198,19
1.5.7	RECOMPOSIÇÃO DE REDE DE ÁGUA DANIFICADA DURANTE OS SERVIÇOS, COM TUBO DE PVC D=20mm SOLDÁVEL, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, C/ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	5.200,00	36,23	188.396,00	731,09	14,06%	26.487,45	565,00	10,87%	20.470,12	1.296,10	24,92%	46.957,57	3.903,90	75,08%	141.438,43
1.6	PAVIMENTAÇÃO				11.455.442,40			3.446.861,09			1.012.525,95			4.459.387,04			6.996.055,36
1.6.1	EXECUÇÃO DE BASE				428.444,02			148.399,00			35.406,11			183.805,11			246.638,91
1.6.1.1	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	4.368,00	1,82	7.949,76	1.903,23	43,57%	3.463,87	311,62	7,13%	567,15	2.214,85	50,71%	4.031,02	2.153,15	49,29%	3.918,74
1.6.1.2	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	4.368,00	0,08	349,44	614,13	14,06%	49,13	474,65	10,87%	37,96	1.088,77	24,93%	87,09	3.279,23	75,07%	262,35
1.6.1.3	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado	m³	4.368,00	19,27	84.171,36	1.903,23	43,57%	36.675,15	311,62	7,13%	6.004,95	2.214,85	50,71%	42.680,10	2.153,15	49,29%	41.491,26
1.6.1.4	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	6.552,00	1,82	11.924,64	2.210,29	33,73%	4.022,72	548,92	8,38%	999,04	2.759,21	42,11%	5.021,76	3.792,79	57,89%	6.902,88
1.6.1.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m²	6.552,00	7,23	47.370,96	2.210,28	33,73%	15.980,35	548,92	8,38%	3.968,72	2.759,21	42,11%	19.949,07	3.792,79	57,89%	27.421,89
1.6.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTICO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
1.6.1.7	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	271.252,80	1,02	276.677,86	86.478,22	31,88%	88.207,78	23.361,07	8,61%	8.007,00	109.839,29	40,49%	112.036,07	161.413,51	59,51%	164.641,79
1.6.2	RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO (USINA)				1.204.489,98			517.041,53			86.914,20			603.955,73			600.534,25
1.6.2.1	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	52,42	7.665,35	401.786,98	20,91	39,88%	160.244,44	3,98	7,60%	30.538,26	24,89	47,48%	190.782,70	27,53	52,52%	211.004,28
1.6.2.2	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	21,84	4.370,96	95.461,77	11,13	50,95%	48.637,91	1,35	6,20%	5.919,95	12,48	57,15%	54.557,86	9,36	42,85%	40.903,91
1.6.2.3	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINÁRIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	131,04	5.397,14	707.241,23	57,10	43,57%	308.159,18	9,35	7,13%	50.455,99	66,45	50,71%	358.615,17	64,59	49,29%	348.626,06
1.6.3	IMPRIMAÇÃO CM-30				22.713,60			6.545,09			2.044,19			8.589,28			14.124,32
1.6.3.1	Impressão com emulsão asfáltica	m²	43.680,00	0,52	22.713,60	12.586,71	28,82%	6.545,09	3.931,13	9,00%	2.044,19	16.517,84	37,82%	8.589,28	27.162,16	62,18%	14.124,32
1.6.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C				15.288,00			4.405,35			1.375,90			5.781,25			9.506,75
1.6.4.1	Pintura de ligação	m²	43.680,00	0,35	15.288,00	12.586,71	28,82%	4.405,35	3.931,14	9,00%	1.375,90	16.517,85	37,82%	5.781,25	27.162,15	62,18%	9.506,75
1.6.5	CAPA ASFÁLTICA - (E= 5 CM)				1.945.944,00			560.737,95			175.131,78			735.869,73			1.210.074,27
1.6.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE	m³	2.184,00	891,00	1.945.944,00	629,34	28,82%	560.737,95	196,56	9,00%	175.131,78	825,89	37,82%	735.869,73	1.358,11	62,18%	1.210.074,27
1.6.6	TRANSPORTE LOCAL DO MATERIAL BETUMINOSO				110.388,10			34.315,16			9.617,91			43.933,07			66.455,03
1.6.6.1	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	136.281,60	0,81	110.388,10	42.364,40	31,09%	34.315,16	11.873,96	8,71%	9.617,91	54.238,36	39,80%	43.933,07	82.043,24	60,20%	66.455,03
1.6.7	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO)				1.092.119,79			855.060,68			29.971,42			885.032,10			207.087,69
1.6.7.1	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	273,00	367,35	100.286,55	272,83	99,94%	100.223,41	0,02	0,01%	7,98	272,85	99,95%	100.231,39	0,15	0,05%	55,16
1.6.7.2	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.828,00	1,02	10.024,56	8.415,14	85,62%	8.583,44	178,63	1,82%	182,20	8.593,76	87,44%	8.765,64	1.234,24	12,56%	1.258,92
1.6.7.3	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	273,00	4,84	1.321,32	38,38	14,06%	185,77	29,64	10,87%	143,57	68,05	24,93%	329,34	204,95	75,07%	991,98
1.6.7.4	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	1.310,40	32,85	43.046,64	887,57	67,73%	29.156,76	53,46	4,08%	1.756,10	941,03	71,81%	30.912,86	369,37	28,19%	12.133,78



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 3ª

DATA: 29/05/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 A 31/05/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.6.7.5	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.070,40	1,02	34.751,81	25.890,24	75,99%	26.408,04	1.034,22	3,04%	1.054,91	26.924,46	79,03%	27.462,95	7.145,94	20,97%	7.288,86
1.6.7.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais- Usinagem	t	1.310,40	208,05	272.628,72	933,79	71,26%	194.275,29	47,61	3,63%	9.906,24	981,41	74,89%	204.181,53	328,99	25,11%	68.447,19
1.6.7.7	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	5,46	4.370,96	23.865,44	5,46	100,00%	23.865,44	0,00	0,00%	-	5,46	100,00%	23.865,44	0,00	0,00%	0,00
1.6.7.8	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	65,52	5.397,14	353.620,61	46,69	71,26%	251.990,13	2,38	3,63%	12.849,15	49,07	74,89%	264.839,28	16,45	25,11%	88.781,33
1.6.7.9	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual	m²	546,00	462,59	252.574,14	476,39	87,25%	220.372,40	8,80	1,61%	4.071,27	485,19	88,86%	224.443,67	60,81	11,14%	28.130,47
1.6.8	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS (EXECUÇÃO DE REMENDO PROFUNDO e MICROREVESTIMENTO)				4.384.688,39			1.003.826,48			427.442,80			1.431.269,28			2.953.419,11
1.6.8.1	Remoção manual de camada granular do pavimento	m²	2.457,00	236,03	579.925,71	577,48	23,50%	136.302,67	237,63	9,67%	56.087,32	815,11	33,17%	192.389,99	1.641,89	66,83%	387.535,72
1.6.8.2	Remoção manual de revestimento asfáltico	m²	819,00	367,35	300.859,65	347,19	42,39%	127.538,93	59,65	7,28%	21.912,96	406,84	49,67%	149.451,89	412,16	50,33%	151.407,76
1.6.8.3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	117.936,00	1,02	120.294,72	33.288,00	28,23%	33.953,76	10.702,06	9,07%	10.916,10	43.990,06	37,30%	44.869,86	73.945,94	62,70%	75.424,86
1.6.8.4	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m²	3.276,00	4,84	15.855,84	692,63	21,14%	3.352,32	326,62	9,97%	1.580,82	1.019,24	31,11%	4.933,14	2.256,76	68,89%	10.922,70
1.6.8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL LATERÍTIPO (CASCALHO)	m³	0,00	55,22	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
1.6.8.6	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m² e descarga livre	t	9.828,00	3,37	33.120,36	1.381,76	14,06%	4.656,54	1.067,86	10,87%	3.598,68	2.449,62	24,92%	8.255,22	7.378,38	75,08%	24.865,14
1.6.8.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	147.420,00	0,81	119.410,20	20.726,44	14,06%	16.788,42	16.017,88	10,87%	12.974,48	36.744,33	24,92%	29.762,90	110.675,67	75,08%	89.647,30
1.6.8.8	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	3.931,20	208,05	817.886,16	1.109,60	28,23%	230.852,28	356,74	9,07%	74.218,77	1.466,34	37,30%	305.071,05	2.464,86	62,70%	512.815,11
1.6.8.9	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA DISTRIBUIDORA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	16,38	4.370,96	71.596,32	13,90	84,89%	60.777,81	0,31	1,91%	1.367,79	14,22	86,80%	62.145,60	2,16	13,20%	9.450,72
1.6.8.10	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDOS ICMS, ALÉM DO TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA, CONFORME A PORTARIA)	t	196,56	5.397,14	1.060.861,84	39,24	19,96%	211.768,86	19,89	10,12%	107.350,94	59,13	30,08%	319.119,80	137,43	69,92%	741.742,04
1.6.8.11	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	3.931,20	32,85	129.139,92	552,71	14,06%	16.156,37	427,14	10,87%	14.031,66	979,85	24,92%	32.188,03	2.951,35	75,08%	96.951,89
1.6.8.12	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m² e descarga livre	t	8.353,80	3,57	29.823,07	1.174,50	14,06%	4.192,96	907,68	10,87%	3.240,42	2.082,18	24,92%	7.433,38	6.271,62	75,08%	22.389,69
1.6.8.13	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	319.410,00	1,02	325.798,20	44.907,30	14,06%	45.805,45	34.705,41	10,87%	35.399,52	79.612,71	24,92%	81.204,97	239.797,29	75,08%	244.593,23
1.6.8.14	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m²	1.008,00	454,55	458.186,40	141,72	14,06%	64.418,51	109,52	10,87%	49.784,12	251,24	24,92%	114.202,63	756,76	75,08%	343.983,77
1.6.8.15	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	63.000,00	5,11	321.930,00	8.857,46	14,06%	45.261,60	6.845,25	10,87%	34.979,22	15.702,70	24,92%	80.240,82	47.297,30	75,08%	241.689,18
1.6.9	RECOMPOSIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE				2.251.366,53			316.529,85			244.621,64			561.151,49			1.690.215,04
1.6.9.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF - 12/2020	m²	5.460,00	41,42	226.153,20	767,65	14,06%	31.795,91	593,25	10,87%	24.572,61	1.360,90	24,92%	56.368,52	4.099,10	75,08%	169.784,68
1.6.9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM	m²	13.104,00	142,39	1.865.878,56	1.842,35	14,06%	262.332,34	1.423,81	10,87%	202.736,55	3.266,16	24,92%	465.068,89	9.837,84	75,08%	1.400.809,67
1.6.9.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.838,60	0,95	3.646,67	539,68	14,06%	512,70	417,08	10,87%	396,23	956,76	24,92%	908,93	2.881,84	75,08%	2.737,74
1.6.9.4	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural	tkm	65.415,17	2,38	155.688,10	9.197,02	14,06%	21.888,90	7.107,67	10,87%	16.916,25	16.304,68	24,92%	38.805,15	49.110,49	75,08%	116.882,95
1.7	DRENAGEM URBANA				9.178.057,02			1.290.384,69			997.239,40			2.287.624,09			6.890.432,93
1.7.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	5.000,00	74,83	374.150,00	702,97	14,06%	52.603,45	543,27	10,87%	40.653,17	1.246,25	24,92%	93.256,62	3.753,75	75,08%	280.893,38
1.7.2	Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	5.000,00	84,49	422.450,00	702,97	14,06%	59.394,16	543,27	10,87%	45.901,20	1.246,25	24,92%	105.295,36	3.753,75	75,08%	317.154,64
1.7.3	Calação manual com fixador de cal	m²	15.600,00	3,94	61.464,00	2.193,27	14,06%	8.641,50	1.695,01	10,87%	6.678,35	3.888,29	24,92%	15.319,85	11.711,71	75,08%	46.144,15
1.7.4	Limpeza de bueiro	m²	300,00	26,47	7.941,00	42,18	14,06%	1.116,46	32,60	10,87%	862,82	74,77	24,92%	1.979,28	225,23	75,08%	5.961,72
1.7.5	Limpeza de ponte	m	200,00	5,29	1.058,00	28,12	14,06%	148,75	21,73	10,87%	114,96	49,85	24,92%	263,71	150,15	75,08%	794,29
1.7.6	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	45.350,00	0,88	39.908,00	6.375,97	14,06%	5.610,85	4.927,49	10,87%	4.336,19	11.303,45	24,92%	9.947,04	34.046,55	75,08%	29.960,96
1.7.7	Limpeza de vala de drenagem	m	9.070,00	5,29	47.980,30	1.275,19	14,06%	6.745,77	985,50	10,87%	5.213,29	2.260,69	24,92%	11.959,06	6.809,31	75,08%	36.021,24
1.7.8	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m	m	1.000,00	77,38	77.380,00	140,59	14,06%	10.879,21	108,65	10,87%	8.407,70	249,25	24,92%	19.286,91	750,75	75,08%	58.093,09
1.7.9	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m	m	500,00	25,52	12.760,00	70,30	14,06%	1.793,99	54,33	10,87%	1.386,44	124,62	24,92%	3.180,43	375,38	75,08%	9.579,57
1.7.10	Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada	tkm	45.000,00	1,31	58.950,00	6.326,76	14,06%	8.288,05	4.889,46	10,87%	6.405,19	11.216,22	24,92%	14.693,24	33.783,78	75,08%	44.256,76
1.7.11	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	50,00	26,47	1.323,50	7,03	14,06%	186,08	5,43	10,87%	143,81	12,46	24,92%	329,89	37,54	75,07%	993,61
1.7.12	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	100,00	12,45	1.245,00	14,06	14,06%	175,04	10,87	10,87%	135,28	24,93	24,93%	310,32	75,07	75,07%	934,68
1.7.13	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros	m	100,00	13,81	1.381,00	14,06	14,06%	194,16	10,87	10,87%	150,05	24,92	24,92%	344,21	75,08	75,08%	1.036,79
1.7.14	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	16,00	1.253,58	20.057,28	2,25	14,06%	2.819,94	1,74	10,87%	2.179,32	3,99	24,92%	4.999,26	12,01	75,08%	15.058,02
1.7.15	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	un	10,00	2.952,18	29.521,80	1,41	14,06%	4.150,60	1,09	10,87%	3.207,68	2,49	24,92%	7.358,28	7,51	75,08%	22.163,52
1.7.16	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	363,92	72.784,00	28,12	14,06%	10.233,03	21,73	10,87%	7.908,33	49,85	24,92%	18.141,36	150,15	75,08%	54.642,64
1.7.17	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	1.117,62	223.524,00	28,12	14,06%	31.426,25	21,73	10,87%	24.286,95	49,85	24,92%	55.713,20	150,15	75,08%	167.810,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

NEX EMPREENDIMENTOS LTDA.

CONTRATO Nº: 002/2026 - SINFRA

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA (Região dos Bairros Vila Macedo, Parque São José, Bom Sucesso, Santa Rita, Santa Inês, Nova Imperatriz, Três Poderes, dentre outros) conforme tabela, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

MEDIÇÃO Nº 3ª

DATA: 29/05/2026

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 A 31/05/2026

Item	Descrição	CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			SALDO		
		UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR	QUANT.	%	VALOR
1.7.18	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00	2.386,71	477.342,00	28,12	14,06%	67.111,68	21,73	10,87%	51.865,47	49,85	24,92%	118.977,15	150,15	75,08%	358.364,85
1.7.19	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	2.038,49	2.038.490,00	140,59	14,06%	286.600,57	108,65	10,87%	221.491,60	249,25	24,92%	508.092,17	750,75	75,08%	1.530.397,83
1.7.20	Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação	m	1.000,00	774,19	774.190,00	140,59	14,06%	108.846,89	108,65	10,87%	84.119,41	249,25	24,92%	192.966,30	750,75	75,08%	581.223,70
1.7.21	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,91 - rodovia pavimentada	tkm	26.286,00	1,55	40.743,30												
1.7.22	Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	150,00	7.459,10	1.118.865,00	21,09	14,06%	157.306,31	16,30	10,87%	121.569,99	37,39	24,92%	278.876,30	112,61	75,08%	839.988,70
1.7.23	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconside 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	12,00	3.777,50	45.330,00	1,69	14,06%	6.373,15	1,30	10,87%	4.925,32	2,99	24,92%	11.298,47	9,01	75,08%	34.031,53
1.7.24	Boca de BSTC D = 1,50 m - esconside 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	10,00	9.881,26	98.812,60	1,41	14,06%	13.892,51	1,09	10,87%	10.736,46	2,49	24,92%	24.628,97	7,51	75,08%	74.183,63
1.7.25	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconside 0° - areia e brita comerciais	un	4,00	44.136,08	176.544,32	0,56	14,06%	24.821,17	0,43	10,87%	19.182,38	1,00	24,92%	44.003,55	3,00	75,08%	132.540,77
1.7.26	Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais	un	16,00	4.235,63	67.770,08	2,25	14,06%	9.528,10	1,74	10,87%	7.363,54	3,99	24,92%	16.891,64	12,01	75,08%	50.878,44
1.7.27	Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais	un	10,00	6.395,06	63.950,60	1,41	14,06%	8.991,11	1,09	10,87%	6.948,54	2,49	24,92%	15.939,65	7,51	75,08%	48.010,95
1.7.28	Demolição de concreto armado com martelo e corte oxiacetileno	m³	50,00	990,78	49.539,00	7,03	14,06%	6.964,91	5,43	10,87%	5.382,65	12,46	24,92%	12.347,56	37,54	75,08%	37.191,44
1.7.29	Demolição manual de concreto simples	m³	50,00	491,89	24.594,50	7,03	14,06%	3.457,85	5,43	10,87%	2.672,31	12,46	24,92%	6.130,16	37,54	75,08%	18.464,34
1.7.30	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	550,00	109,47	60.208,50	77,33	14,06%	8.464,99	59,76	10,87%	6.541,94	137,09	24,92%	15.006,93	412,91	75,08%	45.201,57
1.7.31	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.000,00	15,10	105.700,00	984,16	14,06%	14.860,84	760,58	10,87%	11.484,80	1.744,74	24,92%	26.345,64	5.255,26	75,08%	79.354,36
1.7.32	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	599,24	29.962,00	7,03	14,06%	4.212,49	5,43	10,87%	3.255,51	12,46	24,92%	7.468,00	37,54	75,08%	22.494,00
1.7.33	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	50,00	748,61	37.430,50	7,03	14,06%	5.262,52	5,43	10,87%	4.067,00	12,46	24,92%	9.329,52	37,54	75,08%	28.100,98
1.7.34	Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial	m	2.500,00	86,04	215.100,00	351,49	14,06%	30.241,89	271,64	10,87%	23.371,64	623,12	24,92%	53.613,53	1.876,88	75,08%	161.486,47
1.7.35	Escarvação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m²	17.404,90	8,48	147.593,55	2.447,03	14,06%	20.750,85	1.891,13	10,87%	16.036,74	4.338,16	24,92%	36.787,59	13.066,74	75,08%	110.805,96
1.7.36	Realterro e compactação com soquete vibratório	m²	12.727,79	20,82	264.992,59	1.789,46	14,06%	37.256,51	1.382,93	10,87%	28.792,70	3.172,39	24,92%	66.049,21	9.555,40	75,08%	198.943,38
1.7.37	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	1.000,00	255,74	255.740,00	140,59	14,06%	35.955,65	108,65	10,87%	27.787,37	249,25	24,92%	63.743,02	750,75	75,08%	191.996,98
1.7.38	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m²	280,00	203,87	57.083,60	39,37	14,06%	8.025,64	30,42	10,87%	6.202,41	69,79	24,92%	14.228,05	210,21	75,08%	42.855,55
1.7.39	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	140,00	51,55	7.217,00	19,68	14,06%	1.014,67	15,21	10,87%	784,16	34,89	24,92%	1.798,83	105,11	75,08%	5.418,17
1.7.40	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	609.700,00	0,95	579.215,00	85.720,49	14,06%	81.434,47	66.246,80	10,87%	62.934,46	151.967,29	24,92%	144.368,93	457.732,71	75,08%	434.846,07
1.7.41	Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação	m	300,00	3.292,55	987.765,00	42,18	14,06%	138.874,34	32,60	10,87%	107.325,32	74,77	24,92%	246.199,66	225,23	75,08%	741.565,34
TOTAL DA PLANILHA R\$					23.434.234,39		23,27%	5.453.445,23		9,70%	2.273.313,45		32,97%	7.726.758,68		67,03%	15.707.475,71



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



AV. IMPERATRIZ - 06/05/2026



AV IMPERATRIZ - 06/05/2026



RUA SÃO JOSE - 06/05/2026



RUA SÃO JOSE - 06/05/2026



RUA SÃO JOSE - 08/05/2026



RUA SÃO JOSE - 08/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA SÃO JOSE - 11/05/2026



RUA SÃO JOSE - 11/05/2026



RUA SÃO JOSE - 13/05/2026



RUA SÃO JOSE - 13/05/2026



RUA ACASSIO PEREIRA DE CASTRO - 13/05/2026



RUA 11 - 14/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



AV. JK - 15/05/2026



AV. JK - 15/05/2026



RUA PADRE ANCHIETA - 15/05/2026



RUA PADRE ANCHIETA - 15/05/2026



RUA 11 - 18/05/2026



RUA 11 - 18/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato
Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA PADRE ANCHIETA - 18/05/2026



RUA PADRE ANCHIETA - 18/05/2026



RUA 11 - 21/05/2026



RUA 11 - 21/05/2026



RUA TIRADENTES - 21/05/2026



RUA TIRADENTES - 21/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



RUA TIRADENTES - 22/05/2026



RUA TIRADENTES - 22/05/2026




RUA TIRADENTES - 26/05/2026



RUA TIRADENTES - 26/05/2026



RUA TIRADENTES - 28/05/2026

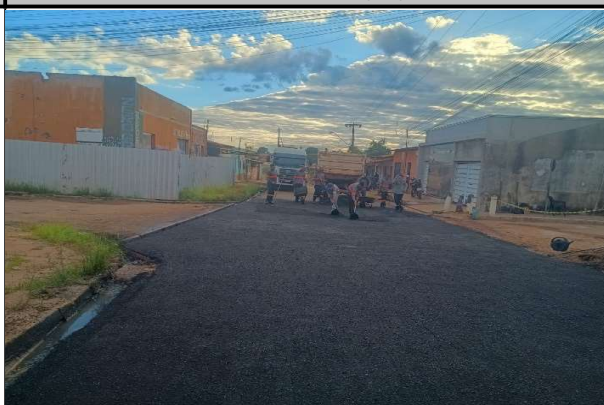

RUA TIRADENTES - 28/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

CONTRATO: N. ° 002/2026 – SINFRA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica destinados à manutenção e recuperação de vias existentes, por meio de recapeamento e/ou reparos pontuais, em atendimento às demandas da Secretária Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no município de Imperatriz - MA

CONTRATADA: NEX EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ.: 50.559.650/0001-40)

MEDIÇÃO 03:

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/05/2026 a 31/05/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




RUA 11 - 28/05/2026



RUA 11 - 28/05/2026



RUA TIRADENTES - 29/05/2026

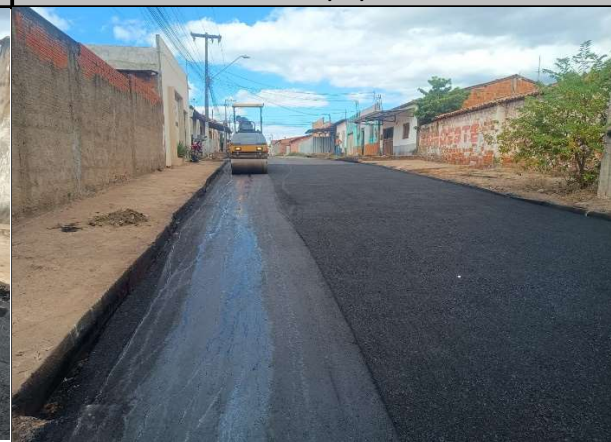

RUA TIRADENTES - 29/05/2026

Jucely Alves Filho

Fiscal de contrato

Matrícula: 85.584-7
